




# Gemeinde Kleinmachnow Sportplatz Neubau - Grobterminplan

Vorgang	Anfang	Ende
◦ Neubau eines Sportplatzes am Dreilindener Weg	29.09.2017	30.07.2019
☐ ◦ Bebauungsplan (B-Plan)	14.12.2017	31.01.2018
◦ Beschluss Gemeindevertretung	14.12.2017	14.12.2017
◦ Ausfertigung und Inkraftsetzung B-Plan	31.01.2018	31.01.2018
◦ TIW Gebiet - Baurechtliche Prüfung + Freigabe	01.11.2017	03.05.2018
☐ ◦ Vergabe von Planleistungen	29.09.2017	03.11.2017
◦ Vertrag Leistungsstufe 1 (Lph 1-3)	29.09.2017	03.11.2017
◦ Abstimmung Planer + Gemeinde (intern)	09.11.2017	09.11.2017
◦ Abstimmung Planer + Nutzer RSV + Gemeinde	14.11.2017	14.11.2017
☐ ◦ Entwurfsplanung	03.11.2017	05.01.2018
◦ Bearbeitung des Planungskonzepts inkl. zeichn. Darstellung und 3 Entwürfen	03.11.2017	05.01.2018
◦ Kostenberechnung	03.11.2017	04.01.2018
◦ Kostenschätzung	03.11.2017	04.01.2018
☐ ◦ Information der Gremien	16.11.2017	28.11.2017
◦ Abgabe für Ausschusssitzungen	16.11.2017	16.11.2017
◦ Fachausschüsse (Bauausschuss, Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales)	27.11.2017	28.11.2017
◦ Erarbeitung des Übertragungsvertrags	29.09.2017	04.12.2017
☐ ◦ Errichtungsbeschluss	09.01.2018	22.02.2018
◦ Abgabe für Ausschusssitzungen	09.01.2018	09.01.2018
◦ Fachausschüsse (Bauausschuss, Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales, Finanzausschuss)	22.01.2018	24.01.2018
◦ Hauptausschuss	12.02.2018	12.02.2018
◦ Beschluss Gemeindevertretung	22.02.2018	22.02.2018
☐ ◦ Vergabe von Planleistungen	23.02.2017	23.02.2017
◦ Vertrag Leistungsstufe 2 (Lph 4-5)	23.02.2017	23.02.2017
☐ ◦ Genehmigungsplanung	26.01.2018	28.02.2018
◦ Erarbeitung der genehmigungspflichtigen Unterlagen	26.01.2018	28.02.2018
◦ Einreichen Baugesuchs und Begleiten des Genehmigungsverfahrens	28.02.2018	28.02.2018
☐ ◦ Baurechtliche Prüfung	01.03.2018	29.05.2018
◦ Prüfung und Freigabe des Baugesuchs	01.03.2018	29.05.2018
◦ TIW Gebiet - Geländeregulierung (in Abhängigkeit von der Baugenehmigung)	03.01.2018	31.07.2018
☐ ◦ Zuwendungsantrag	05.03.2018	02.04.2018
◦ Eigenmittelnachweis für Fördermittel	05.03.2018	26.03.2018
◦ Feiertage 30.03. + 02.04. Karfreitag/ Ostern	30.03.2018	02.04.2018
☐ ◦ Vergabe von Planleistungen	01.06.2018	01.06.2018
◦ Vertrag Leistungsstufe 3 (Lph 6-7)	01.06.2018	01.06.2018
☐ ◦ Ausführungsplanung	04.06.2018	22.06.2018
◦ Erstellung der Ausführungspläne und Einarbeiten der Fachplanungen	04.06.2018	22.06.2018
◦ Detail- und Konstruktionszeichnungen	04.06.2018	22.06.2018
☐ ◦ Vorbereitung der Vergabe	25.06.2018	05.07.2018
◦ Massenermittlung + Leistungsbeschreibungen	25.06.2018	05.07.2018
☐ ◦ Mitwirken bei der Vergabe / Öffentliche Ausschreibung/ Vergabebeschluss/ Hauptausschuss	09.07.2018	24.09.2018
◦ Einholen, Prüfen, Auswerten	09.07.2018	03.08.2018
◦ Kostenanschlag und Kostenkontrolle	06.08.2018	13.08.2018
◦ Vergabeempfehlung	14.08.2018	14.08.2018
◦ Vergabebeschluss/ Hauptausschuss (geschätzt)	17.09.2018	17.09.2018
◦ Zuschlagserteilung	24.09.2018	24.09.2018
◦ TIW Gebiet - Straßenbau beginnend	01.08.2018	01.08.2019
☐ ◦ Vergabe von Planleistungen	04.09.2018	04.09.2018
◦ Vertrag Leistungsstufe 4 (Lph 8)	04.09.2018	04.09.2018
☐ ◦ Baustart/ Objektüberwachung	08.10.2018	04.06.2019
◦ Überwachung und Kordinierung der Ausführung	08.10.2018	08.03.2019
◦ Aufstellen und Fortschreiben eines Zeitplans, Bautagebuch	08.10.2018	08.03.2019
◦ Abnahmen der Bauleistungen, Mängelverfolgung	08.10.2018	08.03.2019
◦ Rechnungsprüfung, kostenfeststellung und Kostenkontrolle	08.10.2018	08.03.2019
◦ ggf. witterungsbedingte Bauzeitverlängerung (Wintermonate)	03.12.2018	01.05.2019
◦ Organisation behördlicher Abnahmen	02.05.2019	15.05.2019
◦ Übergabe des Objektes	03.06.2019	03.06.2019
◦ Auflisten der Gewährleistungsfristen	04.06.2019	04.06.2019
☐ ◦ Vergabe von Planleistungen	15.07.2019	15.07.2019
◦ Vertrag Leistungsstufe 5 (Lph 9)	15.07.2019	15.07.2019
☐ ◦ Verwendungsnachweis	01.07.2019	30.07.2019
◦ Abrechnung der Fördermittel	01.07.2019	30.07.2019
◦	30.07.2019	30.07.2019

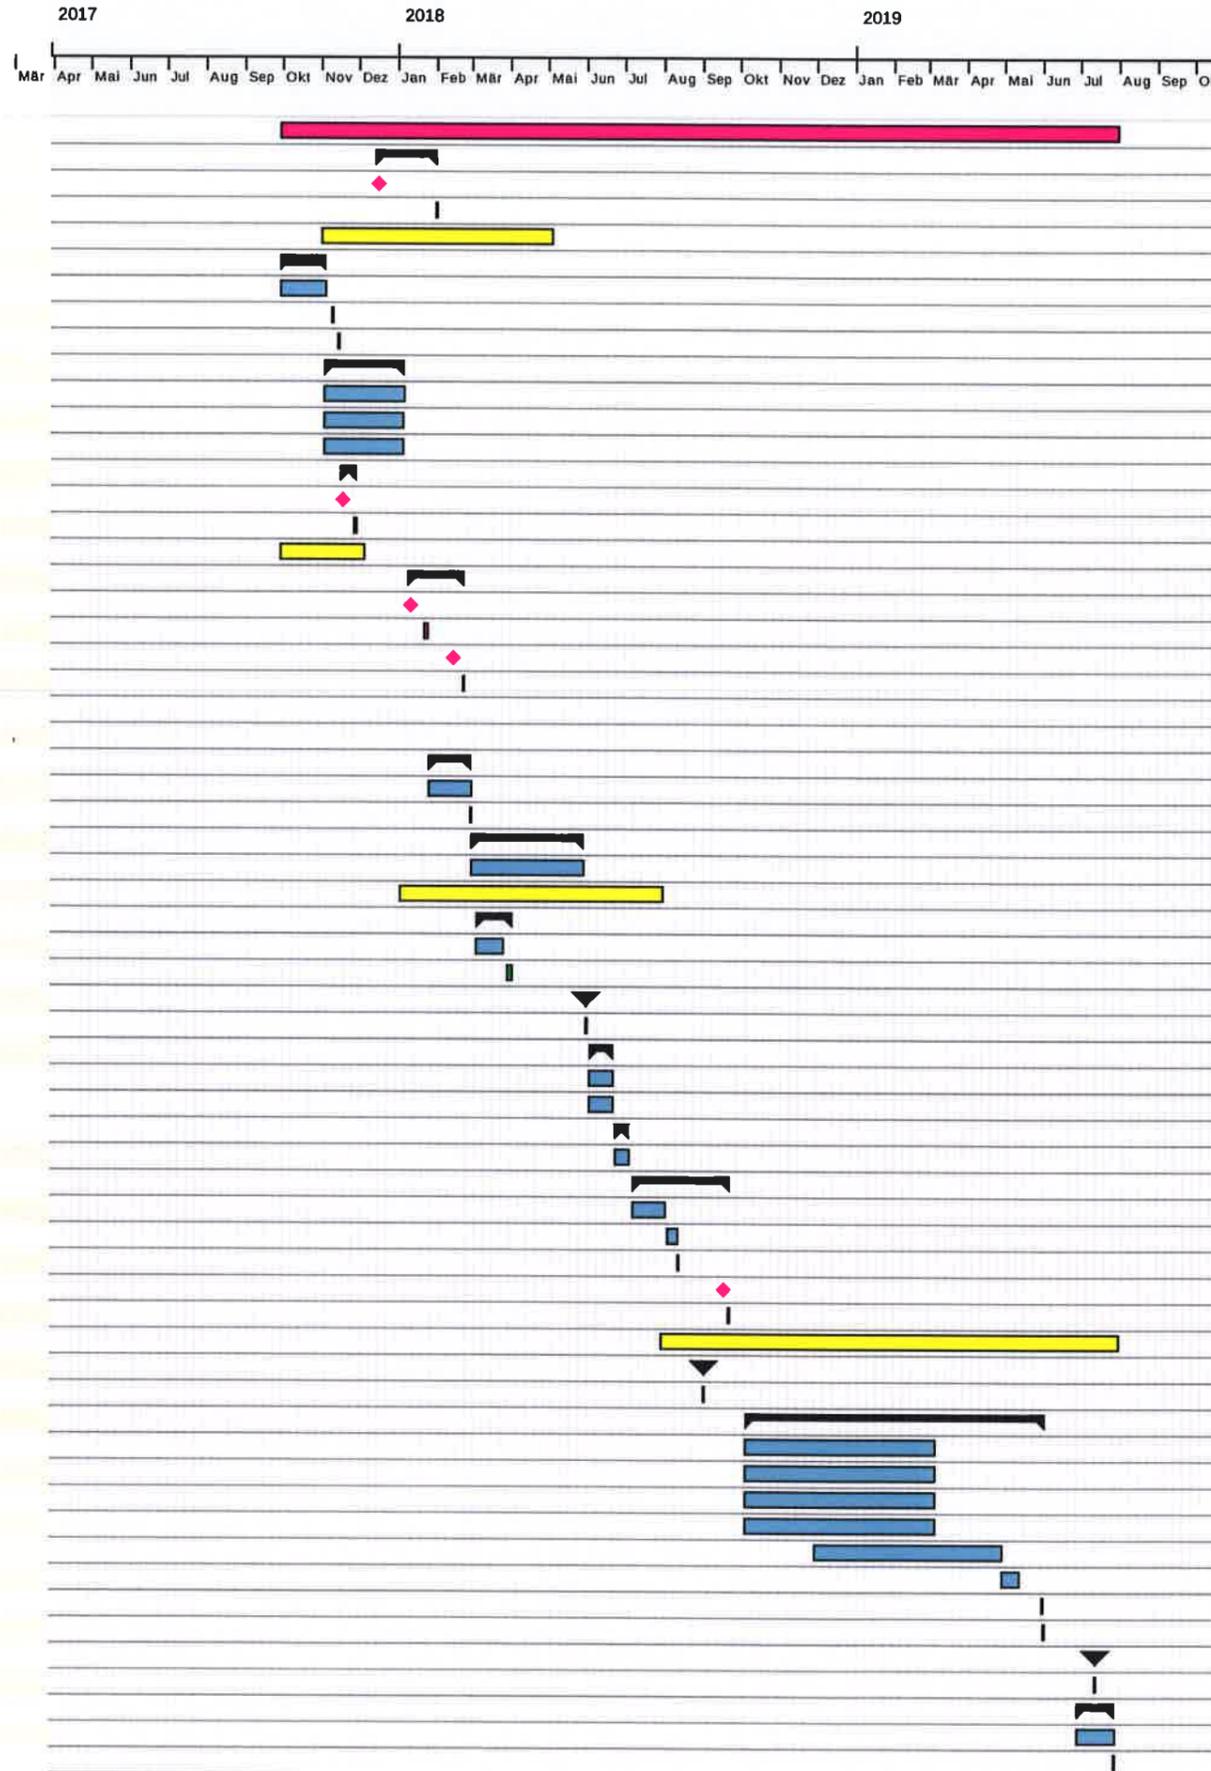

Legende:  
■ Ausschusstermine  
■ Ausführungsfristen  
■ Feiertage
