

Kosten- und Finanzierungsplan

Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten (ohne Europarc Dreilinden)

September 2024

Entwurf



Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow

erarbeitet von:

M. Rahn
Geschäftsführer

EBP

Inhaltsverzeichnis

Gegenüberstellung der wichtigsten Kennzahlen der KoFi Stand September 2024 und September 2023

1	Einleitung.....	1
2	Stand der Entwicklungsmaßnahme und Ausblick	2
3	Der Kosten- und Finanzierungsplan.....	3
3.1	Gliederung	3
3.2	Berechnung der Gesamtfinanzierung der Entwicklungsmaßnahme.....	6
4	Entwicklungsmaßnahme 2022	7
4.1	Kosten	7
4.2	Einnahmen	7
5	Kostenaufwand Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten.....	8
5.1	„Äußere Erschließung“ und teilgebietsübergreifende Maßnahmen	8
5.2	Gebiet klein.mach.now! businesspark (ehem. „Fashion Park“ KLM-BP-006-c).....	12
5.3	KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“.....	17
5.4	KLM-BP-006-d „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“	21
6	Einnahmen Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten	22
6.1	Grundstücksveräußerung.....	22
6.2	Fördermittel	22
6.3	Ausgleichsbeträge.....	23
6.4	Anschlussgebühren	23
6.5	sonstige Einnahmen	23
7	Finanzierung, Vergleich der kumulierten Einnahmen und Ausgaben	24
8	Risikobetrachtung.....	24

Anlage 1: Übersichtskarte Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

Anlage 2: Kosten- und Finanzierungsplan

Anlage 3: Diagramm „Finanzierungsübersicht Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten“

Anlage 4: Chronologie der Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ 1991 – 2024

Gegenüberstellung der wichtigsten Kennzahlen - Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

KoFi September 2023	KoFi September 2024
<u>Quadratmeterpreise:</u> <u>TIW-Gebiet/ östlich Pascalstr.:</u> Gewerbegebiet (GE 3): verkauft Kerngebiet: verkauft Wohngebiet: verkauft Mischgebiet (Plattenbau) 500 EUR/m ² <u>Nördlich Stahnsdorfer Damm</u> <i>Zahlbetrag (Ankaufswert Grundstücke P&E verrechnet) → Ca. 5,0 Mio. EUR</i> <i>Endwerte</i> Gewerbegebiet: 190 EUR/m ²	<u>Quadratmeterpreise:</u> <u>TIW-Gebiet/ östlich Pascalstr.:</u> Gewerbegebiet (GE 3): verkauft Kerngebiet: verkauft Wohngebiet: verkauft Mischgebiet (Plattenbau) 500 EUR/m ² <u>Nördlich Stahnsdorfer Damm</u> <i>Zahlbetrag (Ankaufswert Grundstücke P&E verrechnet) → Ca. 5,0 Mio. EUR</i> <i>Endwerte</i> Gewerbegebiet: 190 EUR/m ²
<u>Gesamteinnahmen Entwicklungsgebiet:</u> 84,8 Mio. EUR	<u>Gesamteinnahmen Entwicklungsgebiet:</u> 84,8 Mio. EUR
<u>Kosten pro Teilgebiet (brutto):</u> Äußere Erschließung: 18,4 Mio. EUR TIW-Gebiet: 38,8 Mio. EUR Nördlich St. Damm: 5,9 Mio. EUR Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg: 14,9 Mio. EUR	<u>Kosten pro Teilgebiet (brutto):</u> Äußere Erschließung: 17,9 Mio. EUR TIW-Gebiet: 40,0 Mio. EUR Nördlich St. Damm: 6,1 Mio. EUR Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg: 14,9 Mio. EUR
<u>Gesamtkosten Entwicklungsgebiet (br.):</u> 84,9 Mio. EUR (inkl. Finanzierungskosten)	<u>Gesamtkosten Entwicklungsgebiet (br.):</u> 85,9 Mio. EUR (inkl. Finanzierungskosten)
<u>Auszahlungen P&E an Gemeinde, soziale Infrastruktur:</u> 0,9 Mio. EUR (Infrastrukturbeitrag)	<u>Auszahlungen P&E an Gemeinde, soziale Infrastruktur:</u> 0,35 Mio. EUR (Infrastrukturbeitrag)
<u>Ergebnis Gesamtfinanzierung:</u> - 0,05 Mio. EUR	<u>Ergebnis Gesamtfinanzierung:</u> - 1,2 Mio. EUR

1 Einleitung

Das Gebiet „Wohnen und Arbeiten“ umfasst ein ca. 113 ha großes Areal, das als Entwicklungsgebiet nach § 6 BauGB-MaßnG (Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch) ausgewiesen und im November 1991 durch das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (MSWV) des Landes Brandenburg (heute Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, MIL) genehmigt wurde. Auf dieser Fläche sind Gewerbe-, Dienstleistungsbetriebe und Wohnbebauung vorgesehen, die mit unterschiedlichen Investorenmodellen realisiert werden. Die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (P&E) - als Geschäftsbesorger der Gemeinde Kleinmachnow - ist mit der Entwicklung des Gebietes und der Erbringung der dazu erforderlichen Koordinierungs- und Projektsteuerungsleistungen beauftragt.

Um eine derart komplexe Aufgabe durchführen zu können, bedarf es eines detaillierten, regelmäßig zu aktualisierenden Überblicks über die Höhe und den zeitlichen Anfall von Kosten und Einnahmen. Auf der Grundlage des § 171 Abs. 2 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, für ihre städtebauliche Entwicklungsmaßnahme einen Kosten- und Finanzierungsplan aufzustellen, der die finanziellen Auswirkungen der geplanten Maßnahmen im Rahmen der Gesamtentwicklung veranschaulicht.

Der Kosten- und Finanzierungsplan (KoFi) dient als Grundlage für:

- die Einschätzung der Durchführbarkeit geplanter Maßnahmen,
- die Kalkulation der notwendigen Veräußerungserlöse,
- Verhandlungen mit potenziellen Investoren,
- Verhandlungen mit Kreditgebern,
- den Nachweis des Kreditbedarfs gegenüber Banken,
- die Beantragung von Fördermitteln,
- die zuwendungsrechtliche Schlussabrechnung,
- Empfehlungen des Aufsichtsrates und Entscheidungen des Gesellschafters,
- die jährliche Erstellung von Wirtschaftsplänen, Geschäfts- und Lageberichten,
- die Erarbeitung von Risikoabschätzungen,
- die Erarbeitung von Vermarktungskonzepten,
- die Berechnung von Ablösebeträgen.

Ausgehend von einer einheitlichen Datenbasis - dem Kosten- und Finanzierungsplan - können somit sämtliche erforderliche Planunterlagen erstellt werden.

Damit der Kosten- und Finanzierungsplan auch zukünftig diesen Anforderungen gerecht werden kann, ist seine Fortschreibung die Grundvoraussetzung.

Das Entwicklungsgebiet ist in folgende unterschiedlich strukturierte Bereiche gegliedert (Anlage 1):

- Europarc Dreilinden (Bebauungsplan KLM-BP-006-a)
- Trasse Stolper Weg (Bebauungsplan KLM-BP-006-b)
- Fashion-Park (Bebauungsplan KLM-BP-006-c). Dieser unterteilt sich in die Teilbebauungspläne:
 - o KLM-BP-006-c-1 „MIOS“
 - o KLM-BP-006-c-2 „Fashion Park/ Östliches Kerngebiet“
 - o KLM-BP-006-c-3 „Technik-Innovation-Wissenschaft“
 - o KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“
- Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg (Bebauungsplan KLM-BP-006-d)
- Nördlich Stahnsdorfer Damm (Bebauungsplan KLM-BP-006-e)

Für die Fläche des „Europarcs Dreilinden“ (ca. 45 ha) wurde mit der Europarc Thyssen Dreilinden GmbH als „mitwirkungsbereiter Eigentümer“ im Jahr 1993 eine Abwendungsvereinbarung über den Verzicht des Grunderwerbs durch die Gemeinde, die durchzuführenden Ordnungsmaßnahmen und die Zahlung eines Ablösebetrages geschlossen.

2 Stand der Entwicklungsmaßnahme und Ausblick

Im Folgenden werden wichtige Einzelmaßnahmen ab dem 2. Halbjahr 2024 benannt. Die Maßnahmen von 1991 bis einschl. 1. Halbjahr 2024 sind in der Anlage 4 enthalten.

vsl. VI. Quartal 2024	Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet „KLM-BP-006-e, Nördlich Stahnsdorfer Damm“.
IV. Quartal 2024	Beginn der inneren Erschließung der Flächen „östlich Pascalstraße“ (u.a. Kelvinstraße).
II. Halbjahr 2024	Vermarktung der gewerblichen Bauflächen nördlich des Stahnsdorfer Damms.
2025	Rückbau des Plattenbaus an der Pascalstraße.
2025	Realisierung des Gehweges am Stolper Weg zwischen Fahrenheitstraße und Autobahnunterführung.
2025	Beginn der inneren Erschließung der Flächen nördlich des Stahnsdorfer Damms.
2026	Einbau der Deckschicht auf der Fahrenheitstraße und der Pascalstraße.

2026	Realisierung des kombinierten Geh- und Radweges am Dreilindener Weg.
------	--

3 Der Kosten- und Finanzierungsplan

3.1 Gliederung

Der Tabellenteil des Kosten- und Finanzierungsplanes gliedert sich in den Kosten-, den Einnahmen- und den Finanzierungsteil und ist in der Anlage 2 dargestellt.

Der Kostenteil wird in Anlehnung an die im Kapitel 1 genannten Bebauungsplangebiete, in folgende Bereiche untergliedert:

- Äußere Erschließung des Entwicklungsgebietes und teilgebietsübergreifende Maßnahmen
- klein.mach.now! businesspark (ehem. Fashion Park)
- KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“
- KLM-BP-006-d „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.

Die Kostenangaben erfolgen mit einem Mehrwertsteueranteil von 19% (2. Halbjahr 2020, 16%), Baukostenzuschuss Trinkwassererschließung 7% MwSt. und Schmutzwassererschließung 0% MwSt.

Der Einnahmenteil unterscheidet:

- Einnahmen aufgrund von Grundstücksveräußerungen, Fördermitteln, Krediten, Gemeindezuweisungen, Ausgleichs- und Ablösebeträgen und Anschlussbeiträgen

Der Finanzierungsteil unterscheidet:

- Finanzierungskosten
- Vergleich der kumulierten Einnahmen und Ausgaben
- Ermittlung des Liquiditätsbedarfs
- Ermittlung des Deckungsbeitrags der Gesamtmaßnahme

Die Variablen im Kosten- und Finanzierungsplan sind:

1. Fördermittel
2. Quadratmeterpreise bei Grundstücksveräußerung
3. Durchschnittlicher Zinssatz Fremdkapital
4. Zeitliche Verteilung und Höhe von Ausgaben und Einnahmen
5. Anteil der einzelnen Teilgebiete an den Kosten der „Äußeren Erschließung“

Für die einzelnen Variablen werden folgende Festlegungen getroffen:

zu 1. Fördermittel

Zur Finanzierung der Kosten der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sind unterschiedliche Fördermittelprogramme in Anspruch genommen worden.

- So wurden in den 90iger Jahren für die Sicherung und Rekultivierung der ehemaligen Deponie Kleinmachnow/ Stahnsdorfer Damm (1. BA: „Profilierungsarbeiten“) vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR, heute Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, MLUK) Fördermittel ausgezahlt.
- Weiterhin wurden Vorlaufkosten für Planungs- und Erschließungsmaßnahmen durch eine Anschubförderung des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (MSWV (heute Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, MIL) finanziert.
- Im Rahmen des Förderprogramms „GRW I – Ausbau der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur“ wurden im Jahr 2017 durch die ILB Planungs- und Beratungsleistungen mit einem Zuschuss gefördert. Im selben Programm wurden im Dezember 2019 Fördermittel für Ausführungsleistungen im TIW-Gebiet über 1,85 Mio. EUR bewilligt.

Die o.g. Fördermittel/ Zuschüsse werden an den Antragsteller, die Gemeinde, ausgezahlt und entsprechend des Geschäftsbesorgervertrages § 8 Abs. 5 dem Treuhandvermögen der P&E zur Finanzierung der beantragten Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

- Von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Potsdam Mittelmark wurden in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen der „Einzelmaßnahmenförderung einer archäologischen Dokumentation an dem Bodendenkmal Boschwerke Dreilinden“ Fördermittel ausgezahlt.

Die detaillierten Ausführungen zur Höhe der ausgezahlten und bewilligten Fördermittel/ Zuschüsse sind dem Kapitel 6.2 zu entnehmen.

zu 2. Quadratmeterpreise

Die Grundstücke im Entwicklungsgebiet werden zum Neuordnungswert veräußert. Der Neuordnungswert entspricht dabei dem Verkehrswert der Grundstücke, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt (§ 169 Abs. 8 BauGB). Bei der Ermittlung dieser Verkehrswerte werden die aktuellen Grundstücksmarktberichte des „Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Potsdam-Mittelmark“ und die vorliegenden Verkehrswertgutachten berücksichtigt. Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, § 79 Abs. 2 veräußert die P&E die Grundstücke des Treuhandvermögens ausschließlich zum sogenannten „vollen Wert“.

zu 3. Durchschnittlicher Zinssatz Fremdkapital

Aufgrund der im Jahr 2022 prolongierten Kreditverträge wird davon ausgegangen, dass der durchschnittliche Zinssatz bis zur vollständigen Tilgung der Kredite ca. 3,5 % betragen wird.

zu 4. Zeitlicher Verlauf und Höhe von Kosten und Einnahmen

Um eine Einschätzung des zeitlichen Verlaufs von Kosten und Einnahmen vornehmen zu können, wird die Zeit-/ Maßnahmenplanung zur Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme kontinuierlich fortgeschrieben.

Die Höhe der absoluten Kosten kann den Jahresscheiben des in der *Anlage 2* dargestellten Planes entnommen werden.

Die Kostenverteilung entspricht den geplanten Erschließungs- und Bauabschnitten. Diese sind abhängig von der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Gemeinde. Der zeitliche Verlauf der Einnahmen aus der Grundstücksveräußerung ist abhängig vom Abschluss der Kaufverträge und den darin festgelegten Kaufpreisfälligkeiten und den aufschiebenden Bedingungen. Sind diese Grundlagen noch nicht bekannt, so wird eine Abschätzung in Abhängigkeit vom Baufortschritt vorgenommen.

zu 5. Anteil der einzelnen Teilgebiete an den Kosten der „Äußeren Erschließung“

Da die jeweiligen Fördermittel den entsprechenden Teilgebieten zugeordnet werden, müssen auch die Kosten der „Äußeren Erschließung“ und der teilgebietsübergreifenden Maßnahmen anteilig auf die einzelnen Teilgebiete umgelegt werden, so dass letztendlich über die Grundstückspreise die Kostendeckung auf Teilgebietsebene eingeschätzt werden kann.

Als Verteilungsschlüssel wurde hierfür das ursprünglich geplante Nettobauland innerhalb der einzelnen Teilgebiete herangezogen:

Teilgebiet	Nettobauland in m ² (ca.)	Anteil	Quelle
klein.mach.now! businesspark	212.417	64%	KLM-BP-006-c, Flächenbilanz (Stand: August 2006, Entwurf 3. Änderung; Fortführung Liegenschaftskataster Juli 2005)
Nördlich Stahnsdorfer Damm	36.750	11%	KLM-BP-006-e, Flächenbilanz, Variante 1 (Stand: Mai 2000, Erschließungskonzept)
Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg	84.353	25%	KLM-BP-006-d, Fortführung Liegenschaftskataster (Stand: 21.01.03)
Gesamt	333.520	100 %	

Da die Kosten der „Äußeren Erschließung“ im Wesentlichen erbracht sind, wird bei zukünftigen Planungsänderungen, die Einfluss auf die Größe des Nettobaulandes haben, auf eine Anpassung des Verteilungsschlüssels verzichtet.

3.2 **Berechnung der Gesamtfinanzierung der Entwicklungsmaßnahme**

Die Berechnung der Gesamtfinanzierung der Entwicklungsmaßnahme wird im Kosten- und Finanzierungsplan folgendermaßen umgesetzt:

1. Um die Kosten der „Äußeren Erschließung“ und der teilgebietsübergreifenden Maßnahmen auf die einzelnen Teilgebiete umlegen zu können, musste o.g. Verteilungsschlüssel entwickelt werden. Dieser entspricht dem Verhältnis des Nettobaulandes der Teilgebiete zueinander (Seite 6, *Anlage 2*).
2. Die Einnahmen, die wie die Kosten der „Äußeren Erschließung“ teilgebietsübergreifend sind, werden ebenfalls im Verhältnis des Nettobaulandes auf die Teilgebiete aufgeteilt (Seite 7, *Anlage 2*).
3. Für jedes Teilgebiet werden die realisierbaren Quadratmeterpreise als Berechnungsgrundlage der Veräußerungserlöse herangezogen (Seiten 8-11, *Anlage 2*).
4. Die Finanzierungsübersicht für das Gesamtgebiet ist auf Seite 12 der *Anlage 2* veranschaulicht.

4 Entwicklungsmaßnahme 2023

4.1 Kosten

Im Jahr 2023 sind Kosten angefallen, die den Teilgebieten wie folgt zugeordnet werden:

Teilgebiet	2023
Äußere Erschließung/ teilge-biets- übergreifende Maßnahmen	95.117 EUR
klein.mach.now! businesspark	402.071 EUR
Nördlich Stahnsdorfer Damm	820 EUR
TOTAL	498.008 EUR

Finanzierungskosten: 149.849 EUR

gesamt 2023: 647.857 EUR

Der Saldo Ende 2022 betrug: -7.189.122 EUR

4.2 Einnahmen

Die Einnahmen 2023 betrugen:

UR-Nr. 29/2015, Kaufvertrag P&E/ Kusche (Ratenzahlung)	48.000 EUR
Pachterlöse	5.622 EUR
Sonstiges (Erstattung Finanzamt)	1.988 EUR
UR-Nr. 1538/2020, Kaufvertrag P&E/ Hr. Krüger (Ratenzahlung)	18.000 EUR
UR-Nr. 1257/2020, Kaufvertrag P&E/ Prien Grundstücks GbR (Ratenz.)	18.000 EUR
Eigenanteile Anlieger Stichstraße vom Dreilindener Weg	131.962 EUR

gesamt 2023: 223.572 EUR

Der Saldo der Entwicklungsmaßnahme betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2023 -7.613.407 EUR.

5 **Kostenaufwand Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten**

Die einzelnen Positionen des Kosten- und Finanzierungsplanes sind detailliert *in der Anlage 2* dargestellt.

Im Textteil wird bei den Erläuterungen hauptsächlich auf die noch ausstehenden Leistungen und Kosten eingegangen. Die bereits angefallenen Kosten werden in der *Anlage 2* pro Kostenart ausgewiesen.

5.1 **„Äußere Erschließung“ und teilgebietsübergreifende Maßnahmen**

Die äußere Erschließung des Entwicklungsgebietes ist im Wesentlichen abgeschlossen.

Mit DS-Nr. 173/12 hat die Gemeindevertretung den Gehwegbau und die Markierung eines Angebotsstreifens für Radfahrer entlang des Stolper Weges zwischen Heidefeld und Heinrich-Hertz-Straße beschlossen. Die Markierung des Angebotsstreifens sowie die Herstellung des Gehwegs zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße sind fertiggestellt. Die Kosten für den Gehwegbau zwischen Kreuzung Stolper Berg/ Fahrenheitstraße und Kreisel Heinrich-Hertz-Straße werden für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Die Realisierung des kombinierten Geh- und Radweges entlang des Dreilindener Weges erfolgt im Zusammenhang mit der Grünverbindung zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg. Die Kosten werden deshalb dem klein.mach.now! businesspark zugeordnet.

Pos. 1.1 Wert

Im Rahmen der äußeren Erschließung sind keine weiteren Grundstücksankäufe vorgesehen. Die Kosten für die getätigten Ankäufe betragen 1,04 Mio. EUR.

Gesamtkosten: 1.042 TEUR

Pos. 1.2 Erwerb inkl. Vermessung

Enthalten sind Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Grundbuchkosten, Grundsteuern, Wertgutachten, Rechtsgutachten, Rechtsberatungskosten und die Kosten für die Kataster- und die Bestandsvermessungen.

Gesamtkosten: 435 TEUR

Pos. 1.4 Herrichten (Wiedernutzbarmachung und Altlastensanierung)

Es werden keine weiteren Kosten für Wiedernutzbarmachung und Altlastensanierung im Rahmen der äußeren Erschließung erwartet.

Gesamtkosten: 78 TEUR

Pos. 2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser

Zur Sicherung der Finanzierung der Schmutzwassererschließung wurde mit dem WAZV „Der Teltow“ ein „Erschließungsvertrag zur Errichtung leitungsgebundener Entwässerungsanlagen für Schmutzwasser im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 06-c Fashion Park der Gemeinde Kleinmachnow“ geschlossen (Oktober 1999). In diesem wurde der Kostenanteil der

P&E, als Geschäftsbesorger der Gemeinde, an der „Äußeren und Inneren Erschließung“ geregelt.

Gesamtkosten: 1.143 TEUR

Pos. 2.1.2 Wasserversorgung

Die Kosten für die Herstellung der Wasserversorgung umfassen im Wesentlichen die Maßnahmen im Rahmen der Realisierung des Stolper Weges.

Gesamtkosten: 53 TEUR

Pos. 2.1.4 Gasversorgung

Die Kosten der Gasversorgung sind im „Vertrag über die erdgasseitige Erschließung des Entwicklungsgebietes Kleinmachnow“ geregelt (Mai 1995).

Gesamtkosten: 25 TEUR

Pos. 2.1.5 Elektroversorgung

Entsprechend des Anschlussangebotes der MEVAG (heute E.ON edis) war ein Baukostenzuschuss in Höhe von 874.432 EUR zzgl. MwSt. zu zahlen (Februar 1995). Die beiden Raten wurden 1995 und 2000 überwiesen. Weiterhin entstanden Kosten für die Veränderungen an vorhandenen Energieanlagen.

Gesamtkosten: 1.028 TEUR

Pos. 2.1.6 Fernmeldetechnik

Die Kosten werden im Wesentlichen von der Telekom übernommen.

Pos. 2.1.7 Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung und Lärmschutz

Von den Verkehrsanlagen der „Äußeren Erschließung“ wurden die Trasse Stolper Weg inkl. Lärmschutzwand und Lärmschutzwall, die Unterführung Stolper Weg inkl. Autobahnanschlussstelle und die Autobahnbrücke Stahnsdorfer Damm und der Dreilindener Weg fertiggestellt. Der Gehweg entlang des Stolper Weges zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße (1. BA ca. 550 m) wurde hergestellt. Für den Gehwegbau im Abschnitt zwischen Kreuzung Stolper Weg/ Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg (Wegeabschnitt 2A) und Dreilindener Weg Kreisel Heinrich-Herz-Str. (Wegeabschnitt 2B) liegen die Kostenschätzungen der Landschaft planen+bauen GmbH vom 24.02.2022 vor. Die Baumaßnahme wird für das Jahr 2025 vorgesehen. Aufgrund der Baukostensteigerungen wird die vorliegende Kostenschätzung um 15% erhöht. Insgesamt werden für beide Wegeabschnitte Kosten i.H.v. 639 TEUR (br.) ausgewiesen.

Gesamtkosten: 4.815 TEUR

Pos. 2.1.8 Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Die Kosten für Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umfassen im Wesentlichen die Landschaftsbauarbeiten am Stolper Weg, die Begrünung des Lärmschutzwalls und der

Lärmschutzwand am Stolper Weg, die Herstellung des straßenbegleitenden Grüns am Dreilindener Weg sowie die Bepflanzung der Lärmschutzwandverlängerung an der BAB A 115.

Gesamtkosten: 770 TEUR

Pos. 2.1.9 Entschädigungen an Eigentümer, Nutzer sowie Verpflichtungen

Entsprechend § 180 Abs. 1 Satz 2 BauGB sollen nachteilige Auswirkungen für die Eigentümer und Nutzer der Flächen im Entwicklungsgebiet gemindert werden. Für Lärmschutzmaßnahmen wurde 1999 eine Entschädigung von 8.910 EUR an die Anwohner am Stahnsdorfer Damm ausgezahlt. Im Grundstückstauschvertrag mit dem Land Brandenburg (Ur-Nr. 262/2023, Notar Dr. Elmenhorst) ist festgelegt, dass die P&E Stellplatzflächen wiederherzustellen hat, die im Rahmen des Tauschvertrages von Land an die P&E übertragen worden sind. Entsprechend der zur Verfügung stehenden Flächen sind durch die P&E maximal 24 Stellplätze zu realisieren. Dafür werden Kosten von 50 TEUR eingestellt.

Gesamtkosten: 63 TEUR

Pos. 2.2 Baustelleneinrichtungen

Die Kosten für die Baustelleneinrichtungen wurden größtenteils mit den konkreten Erschließungsanlagen abgerechnet. Unter der Position 2.2 werden nur die gesondert ausgewiesenen Rechnungen für Baustelleneinrichtungen erfasst.

Gesamtkosten: 41 TEUR

Pos. 3 soziale Infrastruktur

Aus dem Anstieg der Wohnbevölkerung im Entwicklungsgebiet ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Ende 2013 wurde ein Betrag i.H.v. 350 TEUR als Beitrag für die soziale Infrastruktur des Ortes an die Gemeinde ausgezahlt. Auf Grundlage der aktuellen Einnahmenplanung wird derzeit davon ausgegangen, dass zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme keine weiteren Mittel für die soziale Infrastruktur der Gemeinde bereitgestellt werden können.

Gesamt: 350 TEUR

Pos. 7.1 Planungsleistungen

Hierunter fallen die Kosten, die für das Erzielen der Plan- und Baureife entstehen. Dazu gehören Konzeptplanungen (Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgungskonzept, etc.), die nicht nach HOAI vergütet werden, aber die Grundlage für die Projektierungsleistungen darstellen sowie die nach HOAI vergüteten Bebauungsplanungen inkl. Grünordnungsplanungen/ Umweltberichte. Ein Großteil dieser Leistungen wurde in den Jahren 1991 bis 1996 erbracht (siehe Kapitel 2). Für das Jahr 2024 werden Planungskosten für den Gehwegbau im Abschnitt zwischen Kreuzung Stolper Weg/ Fahrenheitstraße und Kreisel Heinrich-Herz-Str. i.H.v. ca. 39,3 TEUR (br.) berücksichtigt (Quelle: Landschaft planen + bauen GmbH, 24.02.2022).

Gesamtkosten: 1.252 TEUR

Pos. 7.2 Projektierungsleistungen

Zu den Projektierungsleistungen sind alle HOAI-Leistungen zu zählen, außer Bebauungsplänen inkl. Grünordnungsplanungen/ Umweltberichte. Für die Jahre 2024 und 2025 werden jährlich pauschal 8.000 EUR eingeplant.

Gesamtkosten: 1.576 TEUR

Pos. 7.3 Bauleitung

Unter der Position Bauleitung werden die Kosten für die Bauoberleitung und die Bauüberwachung zusammengefasst. Für das Jahr 2025 werden die Kosten der örtlichen Bauüberwachung für den Gehwegbau im Abschnitt zwischen Kreuzung Stolper Weg/ Fahrenheitstraße und Kreisel Heinrich-Herz-Str. i.H.v. ca. 17,2 TEUR (br.) berücksichtigt (Quelle: Landschaft planen + bauen GmbH, 24.02.2022).

Gesamtkosten: 92 TEUR

Pos. 7.4 sonstige betriebliche Aufwendungen, Projektsteuerungsleistungen, Buchführung

	2023
Sonstige betriebliche Aufwendungen (z. B. Rechts- und Beratungskosten, Personalkosten, Werbung).	88.439 EUR
Projektsteuerungsleistungen, Buchführung	6.678 EUR

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Projektsteuerungsleistungen und Buchführung werden bis zum Jahr 2026 berücksichtigt.

Gesamtkosten: 5.149 TEUR

5.2 **Gebiet klein.mach.now! businesspark (ehem. „Fashion Park“ KLM-BP-006-c)**

Nettobauland: ca. 186.300 m²

Die Flächen im TIW-Gebiet sind, bis auf die Fläche des Plattenbaus an der Pascalstraße, vollständig vermarktet. Im Bebauungsplangebiet „KLM-BP-006-c-5, östlich der Pascalstraße“ sind noch ca. 13.000 m² Wohnbauland zu entwickeln. Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist die Festlegung getroffen, dass mindestens 75% der Fläche für die „Soziale Wohnraumförderung“ gem. § 9 (1) Nr. 7 BauGB vorzusehen sind. Die Fläche wurde im Dezember 2022 an die gewog veräußert. In der Kostenplanung für das Bebauungsplangebiet KLM-BP-006-c-5 wird davon ausgegangen, dass die öffentlichen Grünflächen, Wege und Stellplätze durch die P&E hergestellt und finanziert werden. Die Maßnahmen der öffentlichen Erschließung sind für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Die Profilierung und Oberflächenabdichtung der ehemaligen Deponie, jetzt Stolper Berg, sind abgeschlossen. Im September 2018 erfolgte die Freigabe des Stolper Bergs für die Öffentlichkeit und die Übergabe an die Gemeinde. Der Grünzug westlich des Wohnblocks am Stahnsdorfer Damm (Eichenhof) wurde im Rahmen der genannten Rekultivierungsmaßnahme bis zum Stolper Berg verlängert und eine Rodelbahn mit Gegenhang hergestellt. Die Celsiusstraße als Verbindungsstraße zwischen der Fahrenheitstraße und dem Dreilindener Weg wurde bis Ende 2019 realisiert und im Sommer 2022 an die Gemeinde übertragen. Die Maßnahme der Geländeregulierung von ca. 71.000 m² inkl. Tiefenenttrümmerung und Altlastensanierung konnte nach über zwei Jahren Anfang 2021 abgeschlossen werden. Die Realisierung der Grünzüge im TIW-Gebiet erfolgte im Jahr 2022. In den Jahren 2023 bis 2025 werden die Hochbaumaßnahmen an der Celsiusstraße und der Pascalstraße umgesetzt.

Bei den Kostenschätzungen für die Erschließungsmaßnahmen im Gebiet östlich der Pascalstraße, die im Jahr 2022 erarbeitet wurden, wird aufgrund der Baupreisentwicklung ein Zuschlag von 20% berücksichtigt.

Pos. 1.1 Wert

Zur Sicherstellung der Ausweisung von vermarktungsfähigen Grundstückszuschnitten im Plangebiet östlich der Pascalstraße wurde im Juni 2023 ein Grundstückstausch mit Wertausgleich zwischen dem Land Brandenburg und der P&E unterzeichnet. Der Wertausgleich in Höhe von 18,3 TEUR wurde im Juli 2023 von der P&E an das Land Brandenburg gezahlt.

Gesamtkosten: 6.861 TEUR

Pos. 1.2 Erwerb inkl. Vermessung

Enthalten sind Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Grundbuchkosten, Grundsteuern, Wertgutachten, Rechtsgutachten, Rechtsberatungskosten und die Kosten für die Kataster- und die Bestandsvermessungen.

Gesamtkosten: 1.127 TEUR

Pos. 1.4 Herrichten (Wiedernutzbarmachung und Altlasten)

Die Leistungen umfassten im Wesentlichen die Sanierungsarbeiten auf den Teilflächen der ehemaligen Biologischen Zentralanstalt (BZA, heute Julius Kühn-Institut) den Abriss der Zollverwaltung, die Profilierung, Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der ehemaligen Deponie sowie die Geländeregulierung und den Rückbau des Gewächshauses im KLM-BP-006-c-5. In den Jahren 2019 bis 2021 fielen weitere Kosten für das Herrichten der Flächen nördlich und südlich der Celsiusstraße an. Diese umfassten die Vorerkundung Altlasten, die Waldrodung, den oberirdischen Rückbau, die Tiefenenttrümmerung, die Bodensanierung, die Geländeregulierung inkl. archäologischer Baubegleitung sowie die Analytik, Ingenieurleistungen, die Ingenieurtechnische Bauüberwachung und die Dokumentation der Baumaßnahme. Der Rückbau der Garagen und Betonflächen im Gebiet „östlich Pascalstraße“ erfolgte im 1. Halbjahr 2024.

Für den Rückbau des Laborgebäudes 1 (Plattenbau), das seit dem Lasten/ Nutzen Übergang zum 31.12.2009 durch das JKI mietfrei genutzt wird, werden im Jahr 2025 Kosten i.H.v. 654 TEUR (br.) berücksichtigt (Kostenschätzung KWS 08/2024).

Im Plangebiet sind keine weiteren Altlastenflächen bekannt. Vorsorglich werden Sanierungskosten i.H.v. 50 TEUR berücksichtigt.

Gesamtkosten: 14.289 TEUR

Pos. 2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser

Im Erschließungsvertrag über die Ablösung des Baukostenzuschusses zwischen dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ und der „P&E“ vom Oktober/November 1999 wird von dem Beitragssatz 3,456 EUR/m² (brutto=netto) und einer geplanten Bruttogeschossfläche von 307.460 m² (Berechnung des Abwasserzweckverbandes auf Grundlage des genehmigten B-Planes „Fashion Park“, Februar 1997) ausgegangen. Aufgrund der Änderungen des Bebauungsplans und der Satzung des WAZV wurde eine Anpassung des Erschließungsvertrags erforderlich. Dieser wurde nach Rechtskraft der Bebauungspläne KLM-BP-006-c-3 und KLM-BP-006-c-5, in denen Festsetzungen zur Berechnungsgrundlage der Bruttogeschossfläche enthalten sind, erarbeitet. Unter Berücksichtigung des von der P&E dem WAZV gewährten Darlehen von 317 TEUR, das mit dem Beitragssatz verrechnet wird, wurde im Frühjahr 2024 eine Restzahlung i.H.v. ca. 121 TEUR vorgenommen. Hinzu kommen die Kosten für die öffentliche Schmutz- und Regenwassererschließung der Kelvinstraße, als innere Erschließung des Gebietes östlich Pascalstraße, i.H.v. ca. 117 TEUR (Quelle: PST GmbH, 17.05.2022). Diese werden für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Gesamtkosten: 700 TEUR

Pos. 2.1.2 Wasserversorgung

Im Vertrag über die Ablösung des Baukostenzuschusses zwischen dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ und der „P&E“ wird von dem Kostensatz 2,56 EUR/m²

geplanter Bruttogeschossfläche ausgegangen. Bei einer möglichen BGF von 304.472 m² ergibt sich ein Beitrag in Höhe von 778.371 EUR zzgl. 7 % Umsatzsteuer. Wie bereits in der Position 2.1.1 erläutert, wird aufgrund der neuen Satzung des WAZV und der überarbeiteten B-Pläne davon ausgegangen, dass sich der Erschließungsbeitrag verringern wird. Für die Trinkwassererschließung der öffentlichen Erschließung im KLM-BP-006-c-5 werden 146 TEUR (Quelle: PST GmbH, 17.05.2022) eingestellt.

Gesamtkosten: 688 TEUR

Pos. 2.1.4 Gasversorgung

Die Kosten der inneren Erschließung des Gebietes werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet. Es wird für die Kosten der Gasversorgung von ca. 0,5 EUR/m² Nettobauland ausgegangen.

Gesamtkosten: 88 TEUR

Pos. 2.1.5 Elektroversorgung

Die Kosten der inneren Erschließung des Gebietes werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet. Es wird für die Kosten der Elektroversorgung von 0,5 EUR/m² Nettobauland ausgegangen. Im Rahmen der Herstellung der Verlängerung Fahrenheitstraße wurden der Rückbau der vorhandenen Trafostation und ein Neubau erforderlich.

Gesamtkosten: 263 TEUR

Pos. 2.1.6 Fernmeldetechnik

Die Kosten werden im Wesentlichen von der Telekom übernommen. Lediglich bei erforderlichen Umverlegungen im Rahmen der Verlängerung der Fahrenheitstraße, waren Kosten von der P&E zu tragen.

Gesamtkosten: 15 TEUR

Pos. 2.1.7 Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung, Lärmschutz und Werbeanlagen

Nach Fertigstellung der wesentlichen Baumaßnahmen entlang der Fahrenheitstraße und Pascalstraße wird auf diesen die Deckschicht eingebaut (ca. 402 TEUR, Quelle: PST GmbH, 17.05.2022). Die Kosten werden für das Jahr 2026 berücksichtigt. Für den kombinierten Geh- und Radweg westseitig entlang des Dreilindener Weges (ca. 440 m) werden 227 TEUR eingestellt (Quelle: Landschaft planen + bauen, 12.03.2021). Zur Erschließung der Wohnbebauung im KLM-BP-006-c-5 ist die Realisierung der Kelvinstraße geplant. Die Herstellungskosten (Quelle: PST inkl. techn. Ausrüstung werden mit ca. 521 TEUR kalkuliert GmbH, 17.05.2022) und in den Jahren 2024/2025 berücksichtigt. Darin enthalten ist die im August 2024 beauftragte Leistung „Straßenbau, Leitungsbau, Kelvinstr. Abschnitt 1“. Die Auftragssumme beträgt 305 TEUR (br.). Auftragnehmer ist die Fa. TEG Glindow. Für die Erschließung des WA 04 an der Fahrenheitstraße werden 12 TEUR berücksichtigt.

Gesamtkosten: 4.242 TEUR

Pos. 2.1.8 Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Der nördliche Teil des Grünzugs zwischen den Mischgebieten wurde im Frühjahr 2001 fertiggestellt. Die Realisierung des südlichen Teils erfolgte im Zuge der Rekultivierung der ehemaligen Deponie „Stolper Berg“ im Jahr 2015. Die im Rahmen der Waldumwandlung (Rodung ca. 49.185 m²) erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden von der P&E mit Verträgen (Berliner Stadtgüter GmbH, Forst- und Baumpflegeservice Peter Sobeck, FBG „Forstbetriebsgemeinschaft Fresdorfer Heide w.V.) gesichert. Im Jahr 2025 wird die Rückzahlung eines Sicherheitseinbehaltes für Anwachsgarantien i.H.v. ca. 213 TEUR von der Forstbehörde an die P&E berücksichtigt. In den Jahren 2024 und 2025 fallen jeweils ca. 23 TEUR für die Entwicklungspflege des Grünzugs an. Für Baumfällungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 100 TEUR eingestellt.

Gesamtkosten: 3.104 TEUR

Pos. 2.2 Baustelleneinrichtungen

Für die Baustelleneinrichtungen wird von Kosten in der Höhe von ca. 1,5 % der Bausumme ausgegangen.

Gesamtkosten: 115 TEUR

Pos. 7.1 Planungsleistungen

Hierunter fallen die Kosten, die für das Erzielen der Plan- und Baureife entstehen. Dazu gehören Konzeptplanungen (Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgungskonzept, etc.), die nicht nach HOAI vergütet werden, aber die Grundlage für die konkreten Projektierungsleistungen darstellen sowie die nach HOAI vergüteten Bebauungs- und Grünordnungsplanungen bzw. Umweltberichte. Im Rahmen des Rückbaus des Plattenbaus an der Pascalstraße sind Leistungen für die Erstellung des Schadstoffkatasters, die Rückbauplanung, die Bauüberwachung und die Dokumentation erforderlich. Hierfür werden im Jahr 2025 Kosten i.H.v. 59,9 TEUR (br.) eingestellt (Quelle: KWS Geotechnik GmbH, 08/2024). Für die Anwachskontrolle der Grünzüge im TIW-Gebiet werden für den Zeitraum 2022-2024 jährlich 4,1 TEUR (br.) berücksichtigt (Quelle: Landschaft planen+bauen, 12.05.2022). Weiterhin werden pauschal jährlich 10 TEUR für die Planung der medienseitigen Erschließung der Grundstücke eingestellt. Für die Erstellung von Fällanträgen werden im Jahr 2024 12 TEUR und für die archäologische Baubegleitung in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 8 TEUR berücksichtigt.

Gesamtkosten: 3.982 TEUR

Pos. 7.2 Projektierungsleistungen

Zu den Projektierungsleistungen sind alle HOAI-Leistungen zu zählen, außer Bebauungs- und Grünordnungsplanungen. Für die Planung des Geh- und Radweges am Dreilindener Weg wird ein Honorar von 19,3 TEUR berücksichtigt (Quelle: PST GmbH, 07.09.2020). Die

Projektierungsleistungen inkl. Objektüberwachung und Objektbetreuung im Rahmen der inneren Erschließung des Gebietes östlich der Pascalstraße werden mit 120 TEUR (br.) angesetzt (Quelle: PST GmbH, 16.06.2022). Für vermessungstechnische Leistungen im Rahmen erforderlicher Grundstücksabsteckungen, Massenmodellberechnungen und der Erstellung von Bestandsunterlagen werden jährlich 15 TEUR berücksichtigt. Für die Projektierung der Deckschicht auf der Fahrenheitstraße und Pascalstraße werden 30,7 TEUR eingestellt (Quelle: PST GmbH, 16.05.2022).

Gesamtkosten: 3.907 TEUR

Pos. 7.3 Bauleitung

Unter der Position Bauleitung werden die Kosten für die Bauoberleitung und die Bauüberwachung zusammengefasst. Es werden Kosten von 3% der Bausumme berücksichtigt.

Gesamtkosten: 661 TEUR

5.3 KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“

Nettobauland: ca. 27.000 m²

Der Bebauungsplan KLM-BP-006-e „nördl. Stahnsdorfer Damm“ hat mit der Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses am 17.02.2023 Rechtskraft erlangt. Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Nutzungen und Wohnen geschaffen. Festgesetzt werden auch Grün- und Freiflächen sowie Verkehrsflächen.

Das Gebiet „nördlich des Stahnsdorfer Damms“ unterteilt sich in die Flächen der ehemaligen APAG GmbH und der ehem. Fath GmbH. Die Flächen der ehem. APAG GmbH wurden von der P&E erworben und saniert. Die Flurstücke der ehem. Fath GmbH wurden Anfang 2010 im Rahmen einer Zwangsversteigerung veräußert. Da der Erwerber als mitwirkungsbereiter Eigentümer auftreten wird, hat er entsprechend § 154 Abs. 2 BauGB einen Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu zahlen. Der Ausgleichsbetrag besteht aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Bodenwert ohne Aussicht auf Entwicklung (Anfangswert) und dem Bodenwert, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung ergibt (Endwert).

Bei der zeitlichen Umsetzung der Entwicklung wird davon ausgegangen, dass die Erschließung der Flächen nördlich des Stahnsdorfer Damms im Jahr 2025 erfolgen wird.

Die Kostenschätzungen für die Erschließungsmaßnahmen im Gebiet nördlich des Stahnsdorfer Damms wurden in den Jahren 2020 und 2021 erarbeitet. Da die Erschließungsmaßnahmen voraussichtlich im Jahr 2025 realisiert werden, werden aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklungen die Kostenschätzungen um 25% erhöht.

Pos. 1.1 Wert

Die zukünftig öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen werden durch den Grundstückseigentümer kostenlos an die Gemeinde übertragen. Der gutachterlich festgestellte Anfangswert der zu übertragenden Grundstücke wird bei der Berechnung des Ablösebetrages reduzierend zum Ansatz gebracht.

Die Ablösevereinbarung und der Grundstückstauschvertrag (UR-Nr. 151/2022, Notar Maletz) wurde zwischen den Eigentümern, dem Projektentwickler und der Gemeinde Kleinmachnow unterzeichnet. Dabei wird der Anfangswert, der von der P&E zu erwerbenden Grundstücke mit dem Ablösebetrag verrechnet der vom mitwirkungsbereiten Eigentümer zu zahlen ist.

Gesamtkosten: 555 TEUR

Pos. 1.2 Erwerb inkl. Vermessung

Enthalten sind Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Grundbuchkosten, Wertgutachten, Rechtsgutachten, Rechtsberatungskosten und die Kosten für die Kataster- und die Bestandsvermessungen.

Gesamtkosten: 132 TEUR

Pos. 1.4 Herrichten (Wiedernutzbarmachung und Altlasten)

Die Sanierung der ehem. Fath-Fläche ist durch den Eigentümer sicherzustellen. Die Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz stehen, wurden auf Kosten des privaten Eigentümers zurückgebaut. In der Ablösevereinbarung hat sich die P&E verpflichtet, Zäune innerhalb des Waldbereiches zurückzubauen. Für Restarbeiten der Altlastensanierung auf der ehemaligen APAG-Fläche werden 215 TEUR berücksichtigt.

Gesamtkosten: 446 TEUR

Pos. 2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser

Für die Erschließungskosten Schmutzwasser und Regenwasser werden 663 TEUR eingestellt (Quelle: PST GmbH, 07.09.2020). Die Berechnung des Anschlussbeitrages Schmutzwasser erfolgt auf Grundlage der Satzung des WAZV und der Kennzahlen des B-Plans. Es wird von einer Veranlagungsfläche von ca. 20.000 m² ausgegangen. Bei einem Anschlussbeitragsatz von 2,89 EUR/m² ergeben sich Kosten von 57.800 EUR. Der Abschluss des Erschließungsvertrages wird zurzeit vorbereitet.

Gesamtkosten: 725 TEUR

Pos. 2.1.2 Wasserversorgung

Für die Trinkwassererschließung der Flächen nördlich des Stahnsdorfer Damms werden 206 TEUR berücksichtigt (Quelle: PST GmbH, 07.09.2020). Gemäß § 9 der Vertragsbestimmungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Der Teltow“ für die Wasserversorgung (VBW) ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, von den Anschlussnehmern einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen. Der Abschluss des Erschließungsvertrages wird zurzeit vorbereitet.

Gesamtkosten: 315 TEUR

Pos. 2.1.4 Gasversorgung

Die Kosten der inneren Erschließung des Gebietes werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet. Es wird für die Kosten der Gasversorgung von 0,5 EUR/m² Nettobauland ausgegangen.

Gesamtkosten: 14 TEUR

Pos. 2.1.5 Elektroversorgung

Die Kosten der inneren Erschließung des Gebietes werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet. Es wird für die Kosten der Elektroversorgung von 0,5 EUR/m² Nettobauland ausgegangen. Hinzu kommt der Bau einer Trafostation für ca. 30 TEUR.

Gesamtkosten: 49 TEUR

Pos. 2.1.6 Fernmeldetechnik

Die Kosten werden im Wesentlichen von der Telekom übernommen.

Gesamtkosten: 10 TEUR

Pos. 2.1.7 Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung

Bei den Erschließungsflächen im Gebiet wird von einer Fläche von ca. 6.415 m² ausgegangen. Diese umfassen im Gewerbe- und Wohngebiet die Straßen, Gehwege, Stellplätze und Grundstückszufahrten. Für deren Herstellung werden Kosten von ca. 1,1 Mio. EUR berücksichtigt (Quelle: PST GmbH, 07.09.2020). Zurzeit wird die Erschließungsplanung für die Flächen nördlich des Stahnsdorfer Damms erarbeitet. Auf Grundlage dieser Planung können die voraussichtlichen Erschließungskosten entsprechend konkretisiert werden.

Gesamtkosten: 1.219 TEUR

Pos. 2.1.8 Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Die Maßnahmen zur Herstellung von Grün- und Spielflächen sowie für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in der Ablösevereinbarung zwischen dem Eigentümer, der P&E und der Gemeinde geregelt. Es wird davon ausgegangen, dass die P&E die Kosten für die Realisierung des Waldspielplatzes, der öffentlichen Grünflächen und des Straßenbegleitgrüns trägt. Hinzu kommen die Aufwendungen für das Pflanzen von Ersatzbäumen, naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sowie die Anlage eines Kleingewässers für Amphibien.

Gesamtkosten: 1.513 TEUR

Pos. 2.2 Baustelleneinrichtungen und sonstiges

Für die Baustelleneinrichtungen wird von Kosten in der Höhe von 1,5 % der Bausumme inklusive Herrichten ausgegangen. Im Rahmen der Geländeregulierung im TIW-Gebiet wurde eine durch den Bauhof genutzte Halle zurückgebaut.

Gesamtkosten: 92 TEUR

Pos. 7.1 Planungsleistungen

Hierunter fallen die Kosten, die für das Erzielen der Plan- und Baureife entstehen. Dazu gehören Konzeptplanungen (Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgungskonzept, etc.), die nicht nach HOAI vergütet werden, aber die Grundlage für die konkreten Projektierungsleistungen darstellen sowie die nach HOAI vergüteten Bebauungs- und Grünordnungsplanungen bzw. Umweltberichte. Konkret sind hier die Fällanträge, die archäologische Baubegleitung, die Planung und Betreuung der Herstellung des Kleingewässers sowie die abfallrechtliche Beratung zu nennen.

Gesamtkosten: 345 TEUR

Pos. 7.2 Projektierungsleistungen

Zu den Projektierungsleistungen sind alle HOAI Leistungen zu zählen, außer Bebauungs- und

Grünordnungsplanungen. Sobald konkrete Leistungen in Auftrag gegeben werden und die dafür entstehenden Kosten bekannt sind, werden diese als Berechnungsgrundlage herangezogen. Die Projektierungsleistungen wurden aufgrund der entstandenen und der absehbaren Leistungen pauschal eingeschätzt. Für die Erschließungsplanungen im Gebiet werden 211 TEUR kalkuliert (Quelle: Beauftragung PST GmbH, 04/2024).

Gesamtkosten: 673 TEUR

Pos. 7.3 Bauleitung

Die Kosten der Bauleitung werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet.

Gesamtkosten: 74 TEUR

5.4 KLM-BP-006-d „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“

Bruttogeschossfläche:	49.581 m ²
Nettobauland (inkl. Kita):	84.353 m ²
öffentliche Verkehrsfläche:	17.440 m ²
(ohne Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg)	
öffentliche Grün- und Waldfläche:	35.855 m ²
öffentlicher Spielplatz:	561 m ²
kommunales Baugrundstück:	1.542 m ²

Die Entwicklung des Plangebietes ist abgeschlossen. Die entstandenen Kosten sind in der Anlage 2 (Seiten 4 und 5) dargestellt.

6 Einnahmen Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten

6.1 Grundstücksveräußerung

Bei den Grundstücksveräußerungen wird von folgendem zeitlichen Ablauf ausgegangen. Die Flächenausweisungen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

- | | |
|---|-----------|
| - Wohn-/ Mischgebiet (KLM-BP-006-c-5, ehem. GE 1) | 2020-2025 |
| - GE 2 (KLM-BP-006-c-3, Teilfläche) | 1998-2016 |
| - GE 3 (KLM-BP-006-c-3, Teilfläche) | 2018-2020 |
| - Kerngebiet (KLM-BP-006-c-2) | 2013-2018 |
|
 | |
| - nördlich Stahnsdorfer Damm | 2022-2025 |
| - Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg | 1999 |

Von den Flächen, die sich im Eigentum der P&E befinden, sind lediglich noch das Grundstück östlich der Pascalstraße (Plattenbau) und die gewerblichen Flächen nördlich des Stahnsdorfer Damms zu vermarkten.

6.2 Fördermittel

Die Anschubförderung durch das MSWV (heute Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, MIL) beträgt 5.868 TEUR (1993: 1.780 TEUR und 196 TEUR, 1994: 3.129 TEUR, 1995: 562 TEUR, 1996: 256 TEUR, 2004 Rückzahlung 54,7 TEUR).

Vom MUNR (heute Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, MLUK) wurden für das Jahr 1996 868,17 TEUR und 1997 153,39 TEUR bewilligt. Diese wurden für den 1. BA: „Profilierung der ehemaligen Deponie Stahnsdorfer Damm“ eingesetzt. Die 1996 ausgezahlten MUNR Fördermittel konnten nicht in voller Höhe termingerecht ausgegeben werden, so dass 1997 ein Betrag von 155.383 EUR zurückgezahlt wurde. Für den 2. BA: „Oberflächenabdichtung der ehemaligen Deponie“ wurden für 1998 Fördermittel in Höhe von 545,91 TEUR und für 1999 von 265,90 TEUR ausgezahlt. Im Jahr 2004 wurden an das Land Brandenburg Verzugszinsen von 1.059 EUR überwiesen.

Im Jahr 2017 erfolgte die Auszahlung von Fördermitteln der ILB im Programm zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW-I) Planungs- und Beratungsleistungen i.H.v. 61,4 TEUR. Der Antrag zur Förderung von Ausführungsleistungen im TIW-Gebiet wurde Ende September 2017 online über das ILB-Kundenportal eingereicht. Der Zuwendungsbescheid über 1,85 Mio. EUR wurde im Dezember 2019 erteilt. Die Auszahlung der für 2020 bewilligten Mittel i.H.v. 971 TEUR erfolgte im Jahr 2020 und von 784 TEUR im Jahr 2022. Die verbleibenden Mittel i.H.v. 92 TEUR werden nach Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises, voraussichtlich im Jahr 2024 ausgezahlt.

Von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Potsdam Mittelmark wurden in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen der „Einzelmaßnahmenförderung einer archäologischen Dokumentation an dem Bodendenkmal Boschwerke Dreilinden“ 14,8 TEUR Fördermittel ausbezahlt.

6.3 **Ausgleichsbeträge**

In der Abwendungsvereinbarung der Gemeinde Kleinmachnow mit Europarc ist ein Ausgleichsbetrag vereinbart. Die Auszahlung an die Gemeinde erfolgte gestaffelt. 1995 wurden 5.112.919 EUR, 1996 2.556.459 EUR, 2005 600.000 EUR und 2007 1.051.076 EUR gezahlt. Die Zahlung der letzten Rate i.H.v. 475.000 EUR erfolgte im 2. Quartal 2010 über die Gemeinde als Zuschuss an das Treuhandvermögen der P&E.

Die Größe der Landesflächen im Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ beträgt 36.839 m². Für diese Flächen wurde vom Land der vollständige Ablösebetrag für die gewerbliche Nutzung entrichtet.

Die Kosten der „Äußeren Erschließung“ wurden vollständig durch das Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ vorfinanziert. Der Kostenanteil des „Wohngebietes Stolper Weg“ an der „Äußeren Erschließung“ beträgt 862 TEUR. Die Ausgleichsbetragszahlung an die P&E in selber Höhe erfolgte im Jahr 1997.

Für die Fläche des Landesamtes für Geowissenschaften wurde der Ausgleichsbetrag in Höhe von 919,8 TEUR 1998 gezahlt.

Für das Gebiet nördlich des Stahnsdorfer Damms wurde im Jahr 2022 eine Ablösevereinbarung mit dem Grundstückseigentümer, der Gemeinde Kleinmachnow und dem Projektentwickler unterzeichnet. Der Ablösebetrag wurde auf ca. 5,04 Mio. EUR festgelegt und wird nach Herstellung der Erschließungsstraßen, voraussichtlich im Jahr 2025, an die P&E ausgezahlt.

6.4 **Anschlussgebühren**

Für die Einfamilienhausgrundstücke am Stahnsdorfer Damm wurden durch den WAZV Anschlussgebühren in Höhe von 127.312 EUR erhoben und im Rahmen der Baumaßnahmen der P&E erstattet.

6.5 **sonstige Einnahmen**

siehe *Anlage 2* Seite 7

7 Finanzierung, Vergleich der kumulierten Einnahmen und Ausgaben

Aus den kumulierten Differenzen von Einnahmen und Ausgaben ergibt sich der jährliche Kreditbedarf.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 betrug der Saldo der Entwicklungsmaßnahme ca. -7,6 Mio. EUR. Im Jahr 2024 wurden Darlehen i.H.v. 400 TEUR aufgenommen.

Durch die Gemeinde wurde im Dezember 2010 ein P&E-Kredit i.H.v. von 3,5 Mio. EUR bei der ILB getilgt, so dass der Fremdfinanzierungsbedarf zum Ende des Geschäftsjahres 2023 ca. 4,1 Mio. EUR betrug. Entsprechend der Einnahmensituation der P&E werden die Vorleistungen der Gemeinde im Rahmen der Beiträge für die soziale Infrastruktur zurückgezahlt. So wurde Ende 2013 ein Betrag i.H.v. 350 TEUR an die Gemeinde ausgezahlt.

Zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme kann von einem voraussichtlichen negativen Saldo von ca. 1,2 Mio. EUR ausgegangen werden. Dieses Defizit wäre durch die Gemeinde Kleinmachnow zu übernehmen. In der Satzung der Gemeinde Kleinmachnow über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebietes (Drucksache Nr. 186/91) wurde von einem Defizit i.H.v. 5 Mio. DM (2,56 Mio. EUR) ausgegangen.

Der Bürgschaftsrahmen der Gemeinde für die P&E wurde seit 2008 von 19,2 Mio. EUR auf aktuell 7,0 Mio. EUR reduziert.

8 Risikobetrachtung

Die für das Entwicklungsgebiet dargestellten Perspektiven werden derzeit als wahrscheinlichstes Szenario angenommen. Neue Planungen und Kostenschätzungen sowie Planungen Dritter werden kurzfristig in der Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungspläne berücksichtigt und auf ihre finanziellen Auswirkungen hin untersucht.

In der Grundstücksentwicklung sind folgende Risikoebenen zu betrachten, die jeweils einen unterschiedlichen Stellenwert für die Wirtschaftlichkeit der Entwicklungsmaßnahme haben.

1. Entwicklungs- und Vermarktungsrisiko:

Das Entwicklungs- und Vermarktungsrisiko hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund der umfangreichen Flächenverkäufe reduziert. Das gesamte Nettobauland im Entwicklungsgebiet (ohne Europarc) beträgt ca. 29,1 ha. Von der Gesamtfläche sind bereits ca. 28,0 ha vermarktet bzw. belegt. Die geplanten Erlöse für die noch zu vermarktenden Flächen in Höhe von ca. 16,5 Mio. EUR (inkl. Ablösebeträge) sind der wesentliche Bestandteil zur Erreichung der finanziellen Ziele der Entwicklungsmaßnahme.

Neben der Höhe der realisierbaren Quadratmeterpreise spielt auch der Realisierungszeitraum der Veräußerungserlöse in Bezug auf die Finanzierungskosten eine entscheidende Rolle. Die

komplette Vermarktung der im P&E-Eigentum stehenden Flächen wird bis zum Jahr 2025 angestrebt.

Da die Grundstückskaufverträge unter dem Genehmigungsvorbehalt der Gemeinde stehen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass planungsrechtlich zulässige Vorhaben durch die Gemeinde bzw. deren Vertretung abgelehnt werden.

2. Finanzierungsrisiko:

Das Finanzierungsrisiko besteht darin, dass die geplanten Einnahmen nicht in der kalkulierten Höhe und dem prognostizierten Zeitrahmen realisiert werden können, um die vertraglichen Verpflichtungen, die Erschließung des Gebietes und die Realisierung der Entwicklungsziele umzusetzen. Zur Reduzierung des Zwischenfinanzierungsaufwandes werden die Erschließungsmaßnahmen zeitnah zum Vermarktungsfortschritt umgesetzt. So werden die Maßnahmen der Erschließung vorausschauend auf die Nachfrageentwicklung durchgeführt. Der Anstieg des Finanzbedarfs wird durch diese Maßnahmen deutlich eingegrenzt.

Ein zu geringer Bürgschaftsrahmen der Gemeinde könnte dazu führen, dass Kredite zur Finanzierung der laufenden Maßnahmen nicht mehr aufgenommen werden können. Weiterhin könnten Forderungen der Kommunalaufsicht zur Beibringung von Gutachten im Rahmen der Bürgschaftserklärung der Gemeinde zu Auszahlungsverzögerungen auf Seiten des Kreditnehmers führen. Zum 31.12.2022 wurden die Kreditverträge mit der ILB prolongiert. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus weisen die prolongierten Verträge ein höheres Zinsniveau aus.

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Immobilienmarkt besteht grundsätzlich das Risiko, dass die vertraglich vereinbarten Zahlungen für die Grundstücksveräußerungen „östlich der Pascalstraße“ und „nördlich des Stahnsdorfer Damms“ nicht bzw. nicht im vollen Umfang realisiert werden können.

Durch die P&E wird monatlich eine Liquiditätsplanung erarbeitet, die einen viermonatigen Ausblick auf die geplanten Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft gibt. Neben dem Instrument der Kosten- und Finanzierungsplanung, das mögliche langfristige Finanzierungsrisiken aufzeigt, dient die monatliche Liquiditätsplanung zum Erkennen von kurz- und mittelfristigen Finanzierungsrisiken sowie zur Steuerung der Bankguthaben.

3. Restitutionsrisiko:

Auf die Flächen des Entwicklungsgebietes sind keine Restitutionsansprüche angemeldet.

4. Altlastenrisiko

Im Bebauungsplangebiet KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ ist der größere Teil der Gesamtfläche saniert. Im Rahmen der Rück- und Entsiegelungsmaßnahmen sind weitere Untersuchungsverfahren anzuwenden, die eine möglichst sichere Einschätzung des Sanierungsaufwandes erlauben.

Die Sanierungsmaßnahmen auf dem ehem. Fath-Gelände sind durch den aktuellen Grundstückseigentümer zu finanzieren.

5. Risiko der Rückzahlung von Förder- bzw. Vorauszahlungsmitteln

Durch das ehem. Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (heute Ministerium

für Infrastruktur und Landwirtschaft, MIL) wurden im Zeitraum zwischen 1993 und 1996 für das Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ Fördermittel i.H.v. 5,868 Mio. EUR gezahlt. Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung (StBauFR) vom 9. Juli 2009 hat die Gemeinde gem. Pkt. 15.3.2 dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahme eine Schlussabrechnung vorzulegen. Diese bildet die Grundlage für die abschließende Entscheidung über die Förderung der Maßnahme hinsichtlich der gewährten Vorauszahlungsmittel. Ergibt sich bei der Schlussabrechnung ein Einnahmeüberschuss, fordert das LBV den Überschuss von der Gemeinde anteilig zurück (Pkt. 17.3.1.2, StBauFR).

Die im Rahmen des Programms zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW-I) von der ILB ausgezahlten Fördermittel sind Zuschüsse. Hier besteht die Möglichkeit, dass bei einer Nichteinhaltung der Förderbedingungen Rückzahlungen fällig werden.

6. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird seit 2007 mit 19 % berechnet. Für das zweite Halbjahr 2020 wurde der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 16 % berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Mehrwertsteuersatz ab Januar 2021 bis zum geplanten Abschluss der Entwicklungsmaßnahme unverändert bei 19 % liegen wird.


7. Personalbedarf

Für die Projektsteuerung und Durchführung der noch ausstehenden Maßnahmen bis zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme ist ein qualifiziertes Personal erforderlich. Wenn dieses nicht durch die P&E selbst bereitgestellt wird, sind externe Dienstleister zu binden, die eine zügige Maßnahmenumsetzung sicherstellen. Sollte dieses nicht gewährleistet sein, besteht die Gefahr von Vertragsstrafen gegenüber Grundstückskäufern, die aufgrund der Nichterfüllung von zugesicherten Maßnahmen (z.B. Herstellung von Verkehrs- und Mediierschließung) fällig werden könnten.

Anlage 1

Übersichtskarte Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

Gliederung des Entwicklungsgebietes „Wohnen und Arbeiten“

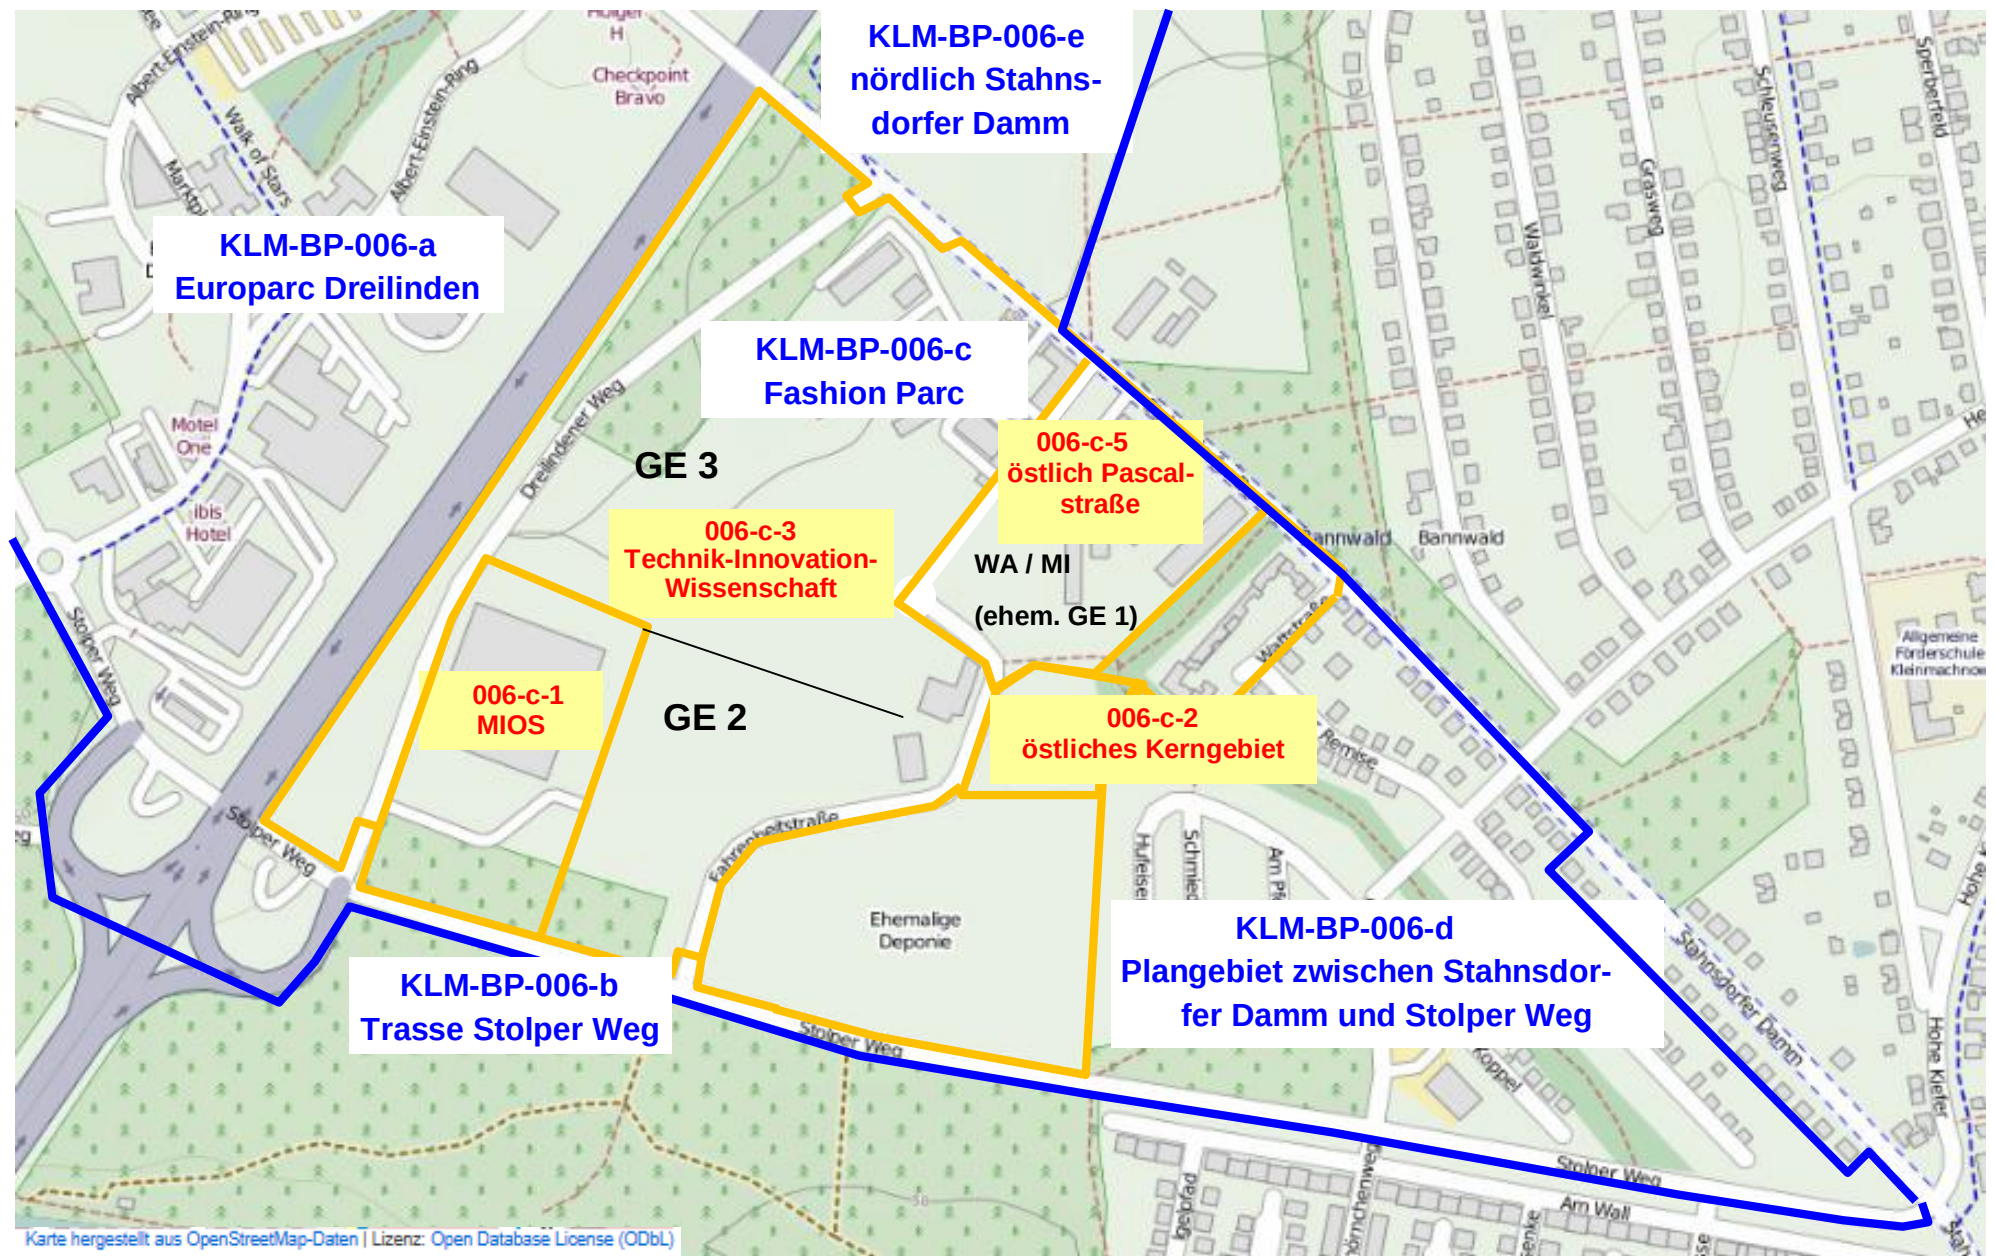

Anlage 2

Kosten- und Finanzierungsplan

Stand: 04.09.2024

Kosten- und Finanzierungsplanung Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten (ohne Europarc Dreilinden)

(aus Übersichtlichkeitsgründen sind die Spalten der Jahre 1996 bis 2020 ausgeblendet, aber in der Spaltensumme enthalten)

Zeitliche Verteilung der Kosten [1.000 EUR] Tätigkeiten (Gliederung gem. DIN 276)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL TEUR
Äußere Erschließung und teilgebietsübergreifende Maßnahmen										
1 Baugrundstück										
1.1 Wert	54	391	92							1.042
1.2 Erwerb inkl. Vermessung	248	32								435
1.4 Herrichten										
1.4.1 Wiedernutzbarmachung		29	31							78
1.4.2 Altlastensanierung										0
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung			215							1.143
2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser										53
2.1.2 Wasserversorgung										25
2.1.4 Gasversorgung										1.028
2.1.5 Elektroversorgung			482							1
2.1.6 Fernmeldetechnik										4.815
2.1.7 Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung			839					639		770
2.1.8 Grünflächen (inkl. Ausgleichsmaßnahmen)		199								63
2.1.9 Entschädigungen an Eigentümer/Nutzer/Verpflichtungen								50		41
2.2 Baustelleneinrichtungen			27							
3 soziale Infrastruktur										350
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen	966	77	95	16				41		1.252
7.2 Projektierungsleistungen	104	374	323					8		1.576
7.3 Bauleitung								17		92
7.4 sonstige betriebliche Aufwend. P&E + Projektsteuerung				110	99	95	80	80	80	5.149
Total	1.372	1.101	2.104	126	99	95	80	835	80	17.914
TOTAL inkl. MwSt (ohne Grunderwerb) in TEUR	1.372	1.101	2.104	126	99	95	80	835	80	17.914

Zeitliche Verteilung der Kosten [1.000 EUR] Tätigkeiten (Gliederung gem. DIN 276)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL TEUR
klein.mach.now businesspark										
1 Baugrundstück										
1.1 Wert	1.607		2.522							6.861
1.2 Erwerb inkl. Vermessung		23	9	28	14	40	61	5	5	1.127
1.4 Herrichten										
1.4.1 Wiedernutzbarmachung		618	438	209	10	1	312	655		8.824
1.4.2 Altlastensanierung				42	78	0	60	30		5.465
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										
2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser							141	162		700
2.1.2 Wasserversorgung								345		688
2.1.4 Gasversorgung					13			20		88
2.1.5 Elektroversorgung					0			30		263
2.1.6 Fernmeldetechnik										15
2.1.7 Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung				309	311	22	177	433	629	4.242
2.1.8 Grünflächen (inkl. Ausgleichsmaßnahmen)			1	330	329	65	159	-102	50	3.104
2.2 Baustelleneinrichtungen							8	35	60	115
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen		70	228	336	305	225	219	158	50	3.982
7.2 Projektierungsleistungen		607	153	88	20	48	83	114	41	3.907
7.3 Bauleitung		6						50	51	661
Total	1.607	1.324	3.351	1.342	1.081	402	1.221	1.935	886	40.041
TOTAL inkl. MwSt (ohne Grunderwerb) in TEUR	1.607	1.324	3.351	1.342	1.081	402	1.221	1.935	886	40.041

Zeitliche Verteilung der Kosten [1.000 EUR] Tätigkeiten (Gliederung gem. DIN 276)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL TEUR
Nördliches Gewerbegebiet, KLM-BP-006-e										
1 Baugrundstück										
1.1 Wert										555
1.2 Erwerb inkl. Vermessung			9	1	14	1	10	20		132
1.4 Herrichten										
1.4.1 Wiedernutzbarmachung			0	34			72	60	20	287
1.4.2 Altlastensanierung							50	25	20	159
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										
2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser								721		725
2.1.2 Wasserversorgung				0				307		315
2.1.4 Gasversorgung								14		14
2.1.5 Elektroversorgung								44		49
2.1.6 Fernmeldetechnik								10		10
2.1.7 Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung								1.219		1.219
2.1.8 Grünflächen (inkl. Ausgleichsmaßnahmen)							232	1.272	9	1.513
2.2 Baustelleneinrichtungen und sonstiges								60		92
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen		27	27	23	22		50	65	20	345
7.2 Projektierungsleistungen		15	75				80	136	5	673
7.3 Bauleitung								40	20	74
Total		43	110	58	37	1	494	3.993	94	6.163
TOTAL inkl. MwSt (ohne Grunderwerb) in TEUR		43	110	58	37	1	494	3.993	94	6.163

Zeitliche Verteilung der Kosten [1.000 EUR] Tätigkeiten (Gliederung gem. DIN 276)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL TEUR
Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg Kosten P & E										
1 Baugrundstück										
1.1 Wert	169	2.059	169							4.576
1.2 Erwerb inkl. Vermessung		1	50							191
1.4 Herrichten										
1.4.1 Wiedernutzbarmachung										27
1.4.2 Altlastensanierung										5
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										104
2.1.9 Entschädigungen										104
2.2 Baustelleneinrichtungen										
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen			61							66
7.2 Projektierungsleistungen		73	105							791
7.3 Bauleitung										6
Summe (Kosten P & E)	169	2.134	385							5.869

Kostenbeteiligung Investor										
1 Baugrundstück										
1.1 Wert										1.918
1.2 Erwerb inkl. Vermessung										51
1.4 Herrichten										
1.4.1 Wiedernutzbarmachung										396
1.4.2 Altlastensanierung										872
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										
2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser										0
2.1.2 Wasserversorgung										1
2.1.4 Gasversorgung										28
2.1.5 Elektroversorgung										
2.1.6 Fernmeldetechnik										
2.1.7 Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung										2.898
2.1.8 Grünflächen (inkl. Ausgleichsmaßnahmen)										590
2.1.9 Entschädigungen										531
2.2 Baustelleneinrichtungen										
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen										602
7.2 Projektierungsleistungen										341
7.3 Bauleitung										114
Projektsteuerung P&E										697
anrechenbare Finanzierungskosten										50
Summe (Kostenbeteiligung Investor)										9.089
Total (P&E + Investor)	169	2.134	385							14.958
TOTAL inkl. MwSt (ohne Grunderwerb) in TEUR	169	2.134	385							14.958

Aufteilung der Kosten der "Äußeren Erschließung" über das Nettobauland der einzelnen Teilgebiete

	Netto- bauland	Prozentschlüssel								Summe
klein.mach.now businesspark	212.417	63,69%								
Nördliches Gewerbegebiet	36.750	11,02%								
Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg (inkl. KiTa)	84.353	25,29%								
Summe	333.520	100,0%								
	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
Kosten der "Äußeren Erschließung" und teil-	1.372	1.101	2.104	126	99	95	80	835	80	17.914
gebietsübergreifende Maßnahmen in (1.000 EUR)										
anteilig klein.mach.now businesspark	871	634	1.211	80	63	61	51	532	51	11.026
anteilig Nördliches Gewerbegebiet	151	122	233	14	11	10	9	92	9	1.976
anteilig Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg	349	346	660	32	25	24	20	211	20	4.912
Summe in TEUR	1.372	1.101	2.104	126	99	95	80	835	80	17.914

Aufteilung der nicht teilgebietsbezogenen Einnahmen auf die einzelnen Teilgebiete (über Nettobauland)

(in 1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
Einnahmen teilgebietsübergreifend										
Fördermittel										
MSWV	1.976	3.129	562							5.868
Eigenanteil Gemeinde (MSWV Fördermittel)	299		1.117							1.453
weitere Gemeindezuweisungen			4.049							8.750
Ausgleichsbeträge										
WG Stolper Weg										862
Anschlußgebühren (EFH Stahnsdorfer Damm)										127
sonstige										
Beteiligung LEG Wertgutachten	15									15
Forstbehörde (Rückzahlung Erfüllungsbürgschaft Planstr. A)										12
Rückzahlung Vorfinanzierung Planung Stammbahn										
Brücke Stahnsdorfer Damm										20
e-plus Standort Miete										8
Funkfeststation Miete (T-Mobil, Viag, Mannesmann)										5
Harbauer Standort Miete										8
Rückzahlung Villaret										47
Verkauf Flstk. 308 an Europarc Ur.Nr. (263/96)										14
L. Ernst										4
Vorbereitende Leistungen Europarc										260
Erstattung Finanzamt										77
Erstattung Grundsteuern, Doppelzahlung										8
Verkauf BRD (Bundesstraßenverwaltung) Ur.Nr. 1154/04										20
Verkauf BRD (Bundesstraßenverwaltung) Ur.Nr. 842/04										30
Verkauf Europarc Ur.Nr. 187/95										11
Kontoauflösung 4266286568										46
Zinsen		1	177							1.202
Summe	2.290	3.130	5.906							18.847
anteilig klein.mach.now businesspark	1.454	1.988	3.751							11.991
anteilig Nördliches Gewerbegebiet	252	345	651							2.084
anteilig Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg	583	797	1.504							4.773
Summe in TEUR	2.290	3.130	5.906							18.847

Finanzierungsübersicht klein.mach.now businesspark

Kosten (1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
klein.mach.now businesspark	1.607	1.324	3.351	1.342	1.081	402	1.221	1.935	886	40.041
anteilig "Äußere Erschließung"	871	634	1.211	80	63	61	51	532	51	11.026
Summe in TEUR	2.478	1.958	4.562	1.422	1.144	463	1.272	2.467	937	51.068

Einnahmen (1.000 EUR)										
klein.mach.now businesspark:										
Zeitliche Verteilung der Einnahmen	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
Aktivitäten										
Gewerbegebiet										
Saacke (2.400 qm)										282
MWA (4.500 qm)										462
MIOS (37.115 qm, davon 8.007 qm Wald)										4.643
416/15										5
417/1										98
417/8										219
418										442
422/3 (alt 422/1)										117
Kusche										483
Abstandsflächen (Tauschvertrag)										161
Kusche (Ur.Nr.: 24/2010, Notar Maletz), (Erweiterungsfl.)										82
Analytica Alimentaria (Ur.Nr. 166/2012, Notar Jacobsen)										433
CountR (Ur.Nr. M321/2013, Notar Mielke)										347
MWA Erweiterungsfläche (Ur.Nr. 118/2014, Notar Jacobsen)										117
Kusche, Andreeva (Ur.Nr. 29/2015, Notar Maletz), (Erweiterungsfl.)				48	48	48	48	11		425
Korr (Ur.Nr. 195/2015, Notar Jacobsen)										200
GLK rückwärtige Grundstück (Ur.Nr. 68/2016, Notar Jacobsen)										282
GLK nördliche Grundstück (Ur.Nr. 69/2016, Notar Jacobsen)										465
MWA Abstandsfläche (Ur.Nr. 99/2016, Notar Jacobsen)										32
STTS (Ur.Nr. 463/2016, Notarin Dr. Schmieder)										165
GLK Abstandsfläche (Ur.Nr. 159/2016, Notar Jacobsen)										53
Analytica Alimentaria nördliche Erweiterungsfläche (5.087 m²)										627
Wacker Neuson (Ur.Nr. 1977/2018F, Notarin Dr. Frank)										1.627
Hr, Drantmann (Notar Dr. Meyer Ur.Nr. /2018)										1.558
Gesellschaft für Raumentw. 4U (Ur.Nr. S 309/2019, Notar Schröter)										300
Görwitz Beteiligungs GmbH (251/2020, Dr. Schütz)					314					1.014
Prien Grundstücks GbR (Ur.Nr 1257/2020, Notar Merz)				240	11	18	18	18	289	593
Bernd Krüger (Ur.Nr 1538/2020, Notar Merz)				254	18	18	257			530
Elektro Anlagenbau Klm. GmbH (Ur.Nr 890/2020, Notarin Stange)				300	158					458
Knut Kleemann (Ur.Nr. 362/2020, Notar Lukoschek)				200	130					330
Kerngebiet										
Christburk Grundbesitz GmbH (Ur.Nr. 2074/2018, Notar Krebs)										1.041
Wohn-/ Mischgebiet										

Eltronik eb (7.946 qm)										1.667
Wohn-/ Mischgebiet (KLM-BP-006-c-5)										
PG Kleinmachnow GmbH (Ur.Nr. 837/2020, Notarin Gregor)				2.400						2.400
gewog Klm. mbH (Ur.Nr 1564/2020, Notar Merz)				1.086						1.086
WA2, WA3 (ca. 11.234 m²)							2.000	6.000		8.000
Teilfläche Plattenbau an Pascalstr. (ca. 1.200 m²)								600		600
Fördermittel										
MUNR (Deponie)										1.833
MUNR Fördermittel Rückzahlung										-156
Landkreis PM, Untere Denkmalschutzbehörde										15
ILB (GRW-I) Planungsleistungen										48
ILB (GRW-I) Ausführungsleistungen					784		92			1.848
Ausgleichsbeträge										
Eichamt (4.410 m²) zzgl. restl. Landesflächen										1.783
Amt für Geowissenschaften (8.567 m²) + Gebäuderestwert										1.465
Amt für Geowissenschaften - Zinsen Kaufvertrag										10
sonstige										
Eigenanteil BBA, Erstattung Land Bbg. verauslagte Kosten		60								97
Forstbehörde (Rückzahlung Erfüllungsbürgschaft 428/22)										24
Senat (Beteiligung an Abrißkosten 428/22)										141
Kostenbeteiligung Anlieger von Zufahrt Dreilindener Weg						132	24			156
Pachteinnahmen, Reservierungsvereinbarung				7	7	5	4			190
Steuerstattungen Finanzamt, Gemeinde, Verrechnungen WAZV				12	18	2				45
Durchführungsvereinbarung Hornbach										37
anteilig dem Teilgebiet zugewiesen	1.454	1.988	3.751							11.991
Summe in TEUR	1.454	2.048	3.751	4.547	1.487	223	2.444	6.630	289	50.872

klein.mach.now businesspark: (in 1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	2.478	1.958	4.562	1.422	1.144	463	1.272	2.467	937	51.068
GESAMTTOTAL Einnahmen	1.454	2.048	3.751	4.547	1.487	223	2.444	6.630	289	50.872
Differenz	-1.024	90	-811	3.125	343	-240	1.172	4.163	-648	-196

Finanzierungskosten	28	37	223	21	15	120	120	80	16	4.603
---------------------	----	----	-----	----	----	-----	-----	----	----	-------

GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	2.507	1.995	4.785	1.443	1.158	583	1.392	2.547	953
GESAMTTOTAL Einnahmen	1.454	2.048	3.751	4.547	1.487	223	2.444	6.630	289

	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	2.507	4.502	9.287	49.038	50.196	50.779	52.171	54.718	55.671
Kumuliertes Gesamttotal Einnahmen	1.454	3.502	7.253	39.816	41.304	41.526	43.970	50.600	50.889
Differenz	-1.053	-1.000	-2.033	-9.222	-8.893	-9.253	-8.201	-4.118	-4.782

Finanzierungsübersicht Nördliches Gewerbegebiet

Kosten (1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
Nördliches Gewerbegebiet		43	110	58	37	1	494	3.993	94	6.163
anteilig "Äußere Erschließung"	151	122	233	14	11	10	9	92	9	1.976
Summe in TEUR	151	164	343	72	48	11	503	4.085	103	8.139

Einnahmen (1.000 EUR)	qm	EUR/qm	TEUR
Ablösevereinbarung			
Ablösebetrag Haußmann Grundbesitz AG			5.041
Verkauf Gewerbegebiet 1	8.175	190	1.553
Verkauf Gewerbegebiet 2	1.884	190	358

Zeitliche Verteilung der Einnahmen	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
Verkauf an Haußmann Grundbesitz AG zum Anfangswert										
Ablösebetrag Haußmann Grundbesitz AG								5.041		5.041
Verkauf Gewerbegebiet 1								1.553		1.553
Verkauf Gewerbegebiet 2								358		358
Fördermittel ILB										14
Projektsteuerungsleistungen Nördliche GE (Vertrag Haußmann AG)										8
Pachterlöse				0	1	1				82
sonstige										
anteilig dem Teilgebiet zugewiesen	252	345	651							2.084
Summe in TEUR	252	345	651	0	1	1		6.952		9.140

Nördliches Gewerbegebiet: (in 1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	151	164	343	72	48	11	503	4.085	103	8.139
GESAMTTOTAL Einnahmen	252	345	651	0	1	1		6.952		9.140
Differenz	101	181	308	-71	-47	-10	-503	2.867	-103	1.001

Finanzierungskosten	5	6	39	5	4	30	30	20	4	971
---------------------	---	---	----	---	---	----	----	----	---	-----

GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	156	171	381	77	51	41	533	4.105	107	
GESAMTTOTAL Einnahmen	252	345	651	0	1	1		6.952		

	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	156	327	708	4.272	4.324	4.365	4.898	9.003	9.110
Kumuliertes Gesamttotal Einnahmen	252	597	1.248	2.186	2.187	2.188	2.188	9.140	9.140
Differenz	96	270	540	-2.087	-2.137	-2.177	-2.710	137	30

Finanzierungsübersicht Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg

Kosten (1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg	169	2.134	385							14.958
anteilig "Äußere Erschließung"	349	346	660	32	25	24	20	211	20	4.912
Summe in TEUR	518	2.479	1.045	32	25	24	20	211	20	19.870

Zeitliche Verteilung der Einnahmen	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
Grundstücksveräußerung										6.659
Kostenbeteiligung Investor										9.089
Ablösebetrag										3.503
Projektsteuerung P&E										697
Erträge aus Weiterberechnung										43
anteilig dem Teilgebiet zugewiesen	583	797	1.504							4.773
Summe in TEUR	583	797	1.504							24.764

Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg: (in 1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	518	2.479	1.045	32	25	24	20	211	20	19.870
GESAMTTOTAL Einnahmen	583	797	1.504							24.764
Differenz	64	-1.682	458	-32	-25	-24	-20	-211	-20	4.894

Finanzierungskosten	11	14	89							1.329
---------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	-------

GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	530	2.494	1.135	32	25	24	20	211	20
GESAMTTOTAL Einnahmen	583	797	1.504						

	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	530	3.023	4.158	20.898	20.923	20.947	20.967	21.179	21.199
Kumuliertes Gesamttotal Einnahmen	583	1.380	2.883	24.764	24.764	24.764	24.764	24.764	24.764
Differenz	53	-1.644	-1.275	3.866	3.841	3.817	3.796	3.585	3.565

Finanzierungsübersicht Gesamtgebiet

Gesamtgebiet: (in 1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	3.148	4.601	5.950	1.525	1.217	498	1.795	6.763	1.060	79.076
GESAMTTOTAL Einnahmen	2.290	3.190	5.906	4.547	1.488	224	2.444	13.582	289	84.792
Differenz	-859	-1.411	-44	3.022	272	-274	649	6.819	-771	5.716

Durchschnittlicher Zinssatz Fremdkapital (ab 2023)	3,5%									
Finanzierungskosten	44	58	351	26	18	150	150	100	20	6.903


GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	3.193	4.659	6.301	1.552	1.235	648	1.945	6.863	1.080
GESAMTTOTAL Einnahmen	2.290	3.190	5.906	4.547	1.488	224	2.444	13.582	289

	vor 1994	1994	1995	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe TEUR
Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	3.193	7.852	14.153	74.208	75.443	76.091	78.036	84.899	85.979	
Kumuliertes Gesamttotal Einnahmen	2.290	5.479	11.385	66.766	68.254	68.478	70.921	84.503	84.792	
Differenz	-903	-2.373	-2.768	-7.443	-7.189	-7.613	-7.115	-396	-1.187	
Kredittilgung durch Gemeinde										3.500
Fremdfinanzierungsbedarf (inkl. Kredittilgung Gemeinde)				-3.943	-3.689	-4.113	-3.615	3.104	2.313	

Anlage 3

Diagramm Finanzierungsübersicht
Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

Finanzierungsübersicht Entwicklungsgebiet "Wohnen und Arbeiten"

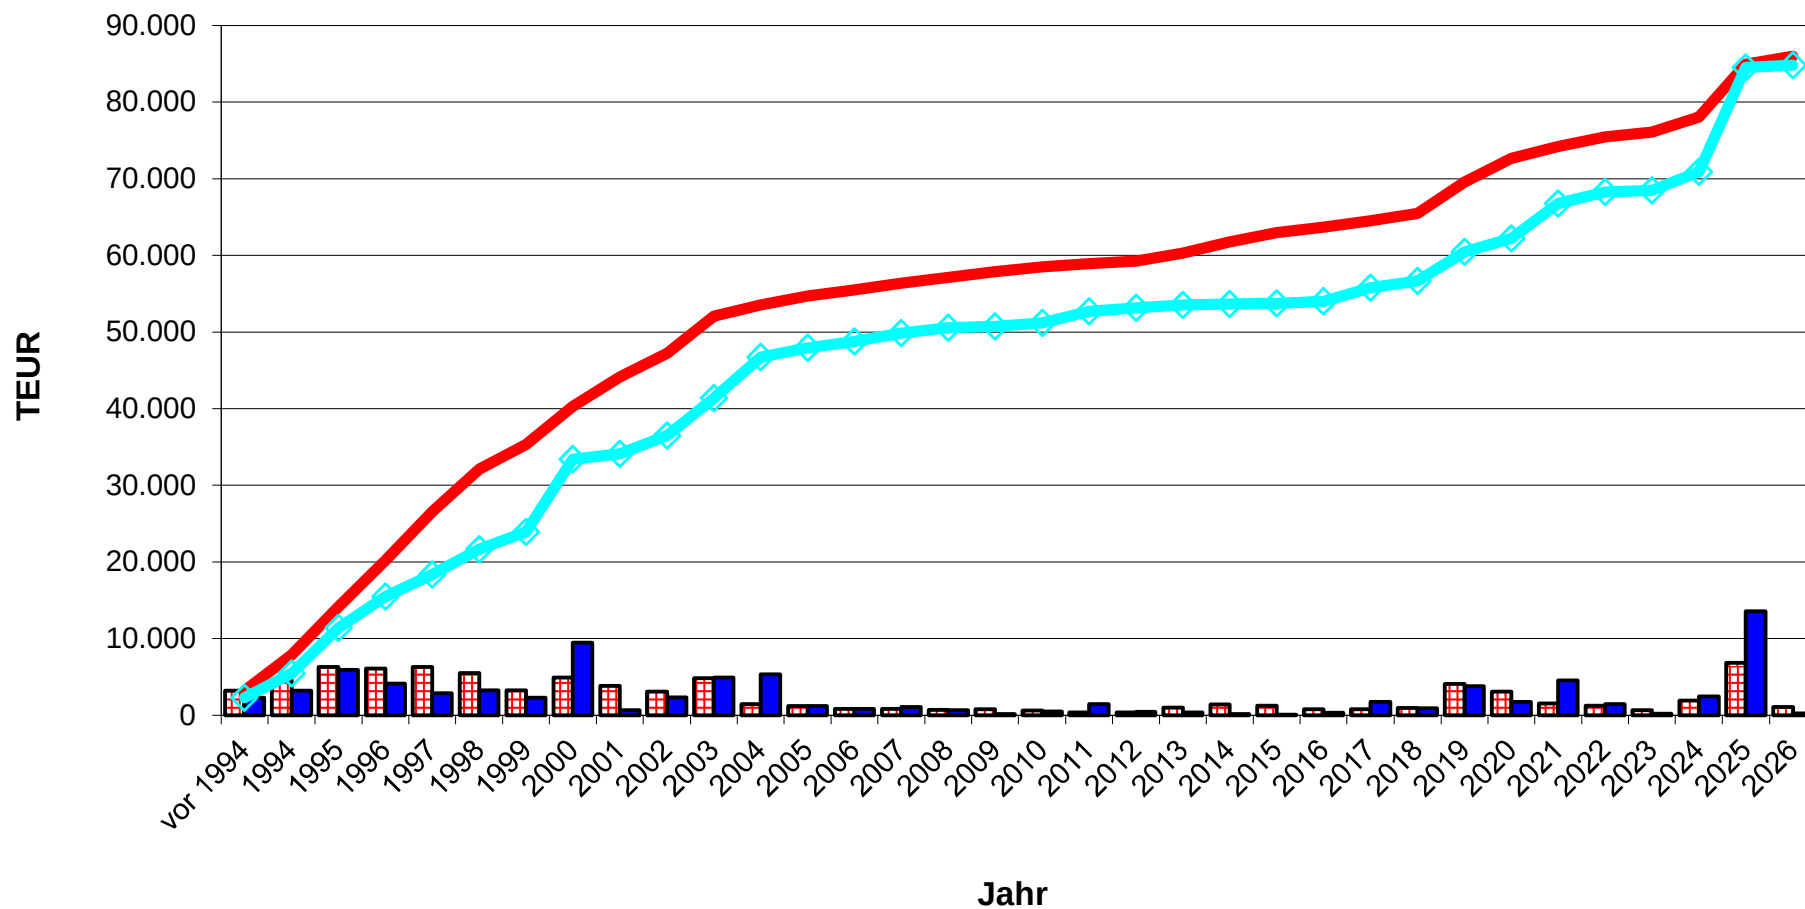

Anlage 4
Chronologie der Entwicklungsmaßnahme
„Wohnen und Arbeiten“ 1991 - 2022

Chronologie der Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ 1991 – 2024

Zeit	Maßnahme
Juli 1991	Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan für das Gesamtgebiet „Wohnen und Arbeiten“.
September 1991	Satzungsbeschluss über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebietes „Wohnen und Arbeiten im Bereich nördlich und südlich der BAB A 115“.
Dezember 1993	Abschluss des Geschäftsbesorgervertrages über die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115“ zwischen der Gemeinde Kleinmachnow und der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft.
April 1995	Abschluss der Abrissarbeiten von Gebäuden und Anlagen auf Teilflächen der ehemaligen BZA (heutige Julius Kühn – Institut, zwischenzeitlich Biologische Bundesanstalt, Außenstelle Kleinmachnow).
April 1996	Der Abwägungs- und Satzungsbeschluss über den Teilbebauungsplan KLM-BP-006-c „Fashion Park“ wird durch die Gemeindevertretung beschlossen.
September 1996	Nach einem Jahr Bauzeit wird die Trasse Stolper Weg inkl. Ver- und Entsorgungsleitungen fertig gestellt.
September 1996	Verkehrsfreigabe der Brücke Stahnsdorfer Damm über die BAB A 115.
Dezember 1996	Änderungs- und Ergänzungsbeschluss zur DS-Nr. 059/96 vom 25.04.1996 (Abwägungs- und Satzungsbeschluss über den Teilbebauungsplan KLM-BP-006-c „Fashion Park“).
Februar 1997	Genehmigung des B-Plans „Fashion Park“ durch das Landesamt für Bauen, Bautechnik und Wohnen (LBBW).
März 1997	Beginn der Bauarbeiten für den 6-streifigen Ausbau der BAB A 115 und die Anschlussstelle Kleinmachnow inkl. Neubau der Autobahnunterführung „Stolper Weg“.
Mai 1997	Abschluss der Sanierungsarbeiten auf dem ehemaligen BZA-Gelände.
Juni 1997	Fertigstellung und Inbetriebnahme der BAB A 115 Anschlussstelle Klm. Ost-Seite.
Juni 1997	Fertigstellung des Sportplatzes an der Förster-Funke-Allee als Ersatz für den zur Bebauung vorgesehenen Sportplatz (Hartplatz) am Stahnsdorfer Damm.
Juli 1997	Abschluss der Profilierungsarbeiten auf der ehemaligen Deponie nach einjähriger Bauzeit.
September 1997	Schmutzwassererschließung (Planstr. B) „Neubau Eichamt“.
September 1997	Erschließung „Fashion Park“ – Abschluss 2. BA Stahnsdorfer Damm und Planstr. C (Schmutz- und Regenwasserkanal, Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung sowie Geh- und Radweg).

September 1997	Fertigstellung der Lärmschutzwand entlang der BAB A 115.
Dezember 1997	Fertigstellung und Inbetriebnahme der BAB A 115 Anschlussstelle Klm. West-Seite (Auffahrt Provisorium).
Februar 1998	Vorlage des überarbeiteten Nutzungskonzeptes für das B-Plangebiet „Fashion Park“.
März 1998	Abschluss der Abrissarbeiten von Gebäuden und Anlagen auf dem Gelände der ehemaligen Zollverwaltung.
April 1999	Fertigstellung der Straße „Dreilindener Weg“ (Planstr. A).
Juli 1999	Verkehrsfreigabe der neuen Autobahnbrücke über den Teltowkanal sowie der Anschlussstelle Klm., West-Seite (seit 1997 provisorische Auffahrt).
September 1999	Fertigstellung der „Fahrenheitstraße“ (Planstraße D/D1) inkl. Ver- und Entsorgungsleitungen (1. BA).
Oktober 1999	Fertigstellung temporäre Oberflächenabdichtung der ehemaligen Deponie Stahnsdorfer Damm.
November 1999 bis Januar 2000	Rückbauarbeiten auf dem APAG-Gelände Kleinmachnow (Baulos 1 – Entrümpelung, Entkernung, Entsorgung).
Dezember 1999	Fertigstellung der Lärmschutzwand an der Nordseite des Stolper Weges.
Dezember 1999	Verkauf der P&E-eigenen Grundstücke im Plangebiet zwischen dem Stahnsdorfer Damm und dem Stolper Weg an die Gesellschaft für Stadterneuerung (GSW, Berlin).
März 2000	Abschluss der Hochbaumaßnahmen „Landesamt für Eich- und Messwesen/ Eichamt Potsdam“.
März 2000	Beginn des Bebauungsplanverfahrens KLM-BP-006-d „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
März 2000 bis Juli 2000	Errichtung des Firmengebäudes der Saacke GmbH und Co. KG.
April 2000	Abschluss der Hochbaumaßnahmen - Neubau (Geb. 5a) des Landesamtes für Geowissenschaften und Rohstoffe.
April 2000 bis Juni 2001	Sanierung des Plattenbaus (Geb. 5) auf dem Gelände des „Amtes für Geowissenschaften“.
Mai 2000	Fertigstellung Landschaftsbauarbeiten Los 1: Begrünung Dreil. Weg und Ergänzung Baumbestand Stahnsd. Damm Los 2: Waldneubegründung und Waldumbau (an der Autobahn) Los 3: Wiederherstellung Wald im Bereich Rigole, Begrünung der Lärmschutzwand Stolper Weg Los 4: Randbegrünung der gesicherten Deponie
September 2000	Fertigstellung von 93 WE durch die SLET Wohnbau GmbH.

September 2000	Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Vorentwurfes des Teilbebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan KLM-BP-006-d.
Oktober 2000	Fertigstellung der Nebenanlagen Fahrenheitstraße (Planstr. D1/D) im Bereich der Grundstücke Fa. Saacke und MWA.
November 2000 bis April 2001	Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung des öffentlichen Nord/ Süd Grünzuges (nördlicher Bereich) im „Fashion Park“.
November 2000	Beginn der Errichtung des Verwaltungs- und Technikgebäudes der MWA.
Oktober 2000	Unterzeichnung Kaufvertrag MESOS-Beteiligungs GmbH und Co Objekt Dreilinden KG.
April 2001	Altlastenuntersuchung Fath-Gelände.
April 2001	Baufeldfreimachung auf dem MIOS-Gelände.
April 2001 bis Juni 2001	Öffentliche Erschließung MIOS-Grundstück.
Mai 2001	Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan KLM-BP-006-e „Nördliches Gewerbegebiet“.
Mai 2001	Beschluss der Gemeindevertretung: Der im Zuge der Sicherung der ehemaligen Mülldeponie entstandene Berg erhält den Namen „Stolper Berg“.
August 2001 bis September 2001	Verlängerung der Fahrenheitstraße (Planstr. D1/D) um ca. 100 m für die Erschließung des MWA-Grundstückes.
November 2001	Eröffnung MIOS Markt.
Dezember 2001	Fertigstellung des Verwaltungs- und Technikgebäudes der MWA.
Januar 2002	Beginn der Freizugs der Fläche im Plangebiet KLM-BP-006-d.
Juni 2002	Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung zum 1. und 2. Entwurf des KLM-BP-006-d.
Juni 2002	Auslegungsbeschluss der Gemeindevertretung zum 3. Entwurf des KLM-BP-006-d.
August 2002	Genehmigung des Erschließungsvertrages Gemeinde/ GSW für das Plangebiet KLM-BP-006-d durch die Gemeindevertretung.
August 2002	Abschluss der Erschließungsverträge GSW/ Medienträger.

August 2002 bis April 2003	Rückbaumaßnahmen, Fäll- und Rodungsarbeiten inkl. Denkmalpflegerische Begleitung im Plangebiet KLM-BP-006-d.
September 2002	Abwägungsbeschluss zum 3. Entwurf des Bebauungsplanes KLM-BP-006-d.
September 2002	Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan KLM-BP-006-d.
Oktober 2002	Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes KLM-BP-006-c „Fashion Park“ durch Änderung des Ursprungsplanes; Aufstellungsbeschluss für die Satzung zur 1. Änderung des B-Planes KLM-BP-006-c.
Oktober 2002	Beginn der Erarbeitung 3. Änderung des B-Planes KLM-BP-006-c „Fashion Park“ durch Änderung des Ursprungsplanes.
November 2002	Beginn der Erschließungsarbeiten im Plangebiet KLM-BP-006-d.
November 2002	Abschluss der Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen (Baulos 2) auf dem ehemaligen APAG-Gelände (Flurstücke 395 und 396).
Dezember 2002	Baureife nach § 30 BauGB für das Plangebiet KLM-BP-006-d.
Januar 2003 bis Mai 2003	Baufeldfreimachung „Beräumung ehem. Kompostierplatz“ im Plangebiet KLM-BP-006-d.
April 2003	Fortschreibung Anfangswertgutachten Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ sowie Erstellung Endwertgutachten „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
April 2003	Beginn der Baumaßnahmen zur Realisierung des Frischemarktes (Netto-Markt) im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
Juli 2003	Eröffnung des Netto-Marktes.
August 2003	Abschluss des Freizugs der Fläche im B-Plangebiet KLM-BP-006-d.
2. Halbjahr 2003	Erarbeitung Entwurf zum Bebauungsplan KLM-BP-006-c „Fashion Park“/ 3. Änderung und TÖB-Beteiligung.
April 2004	Fertigstellung und VOB-Abnahme der öffentlichen Erschließungsanlagen sowie der Trink- und Schmutzwasserleitungen im B-Plangebiet KLM-BP-006-d.
Juni bis August 2004	Flächenberäumung (Beseitigung von oberflächlich aufgeschütteten Baurest- und Bodenaushubmassen) auf Teilflächen im „Fashion Park“ im Vorfeld der geplanten Tiefenentrümmerung.
März 2005	Entscheidung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) in Abstimmung mit dem Land Brandenburg,

	den Standort OST der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA, heute JKI) dauerhaft in Kleinmachnow anzusiedeln.
Dezember 2004 bis Juli 2005	Realisierung der öffentlichen Grünanlagen, Neuanlage und Pflege von Waldflächen (Baulos 1) im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
Februar 2006	Im Zuge der Kreditprolongation wird der Kreditrahmen von 11,2 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR reduziert.
März 2006	Vorlage der Vermarktungsstudie für des Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ durch die Atisreal Consult GmbH und Übergabe an die Gemeinde.
Juni 2006	Beschluss der Gemeindevertretung über die Aufstellung des B-Planes KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ (Technik-Innovation-Wissenschaft bisher Fashion Park).
Juli 2006	Fertigstellung der Lärmschutzwand (Baulos 2) im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
Oktober 2006	Unterzeichnung der „Abschlussvereinbarung zur Rahmenvereinbarung über die städtebauliche Entwicklung von Wohnbauflächen zwischen dem Stahnsdorfer Damm und dem Stolper Weg vom 22.12.1999“
1. Halbjahr 2007	Beginn der ersten Hochbaumaßnahmen im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
Mai/Juni 2008	Beendigung des Vertragsverhältnisses über die „Erbringung von Projektsteuerungsleistung“ mit der DEG Dreilinden Entwicklungsgesellschaft, Abschluss des Vertrages mit der gewog.
Juni 2008	Unterzeichnung Kaufvertrag mit Hr. Kusche über die Ansiedlung des Unternehmens Direktmarketing Kusche GmbH zur Errichtung eine Bürogebäudes und einer Halle auf einem Grundstück mit der Größe von 4.200 m².
September 2008	Unterzeichnung Kaufvertrag mit dem Liegenschaftsfonds Berlin zum Ankauf von Verkehrsflächen der Trasse „Stolper Weg“.
September 2008	Unterzeichnung Übertragungsvertrag mit der Gemeinde Kleinmachnow. Gegenstand des Vertrages sind die öffentlichen Verkehrsflächen „Stolper Weg“, „Am Wall“, „Dreilindener Weg“, „Stellplätze Am Wall“ sowie die Flächen des „Lärmschutzwalls“.
2009	Errichtung eines Bürogebäudes mit Halle für das Unternehmen Direktmarketing Kusche GmbH.

Dezember 2009	Abschluss eines Grundstückstauschvertrages mit dem Land Brandenburg zur Herstellung der Planstraße B und zur Sicherstellung von Abstandsflächen.
Mai 2010	Vorlage des Berichtes „Anregungen zur Verbesserung der Vermarktung im Entwicklungsgebiet“.
2010	Herstellung des öffentlichen Spielplatzes im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
2011	Prüfung der Möglichkeiten zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Stolper Berg.
Herbst 2011	Waldpflegerische Maßnahmen im Bereich zwischen Stolper Weg und Fahrenheitstraße.
Dezember 2012	Abschluss einer Vereinbarung über die Ablösung des Ausgleichsbetrages in dem städtebaulichen Entwicklungsbereich „Wohnen und Arbeiten“ der Gemeinde Kleinmachnow Flurstücke 420/1, 420/2, 421, 4323 zwischen dem Land Brandenburg und der Gemeinde Kleinmachnow.
April 2012	Abschluss eines Grundstückskaufvertrages mit der Analytica Alimentaria GmbH zum Bau eines Büro- und Laborgebäudes.
Juni 2012	Ausarbeitung einer Bindungsvereinbarung und Vorlage beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV).
Juni 2012	Vorlage des Strukturkonzeptes der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH zur weiteren Entwicklung des Gebietes „Technik-Innovation-Wissenschaft“ im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ in Kleinmachnow beim Gesellschafter.
Juli 2012	Ablehnung der Bindungsvereinbarung durch das BMELV.
Dez. 2012	Fertigstellung des Neubaus „Laborgebäude Fahrenheitstr. 5“ des Unternehmens Analytica Alimentaria.
April 2013	Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestages den Standort des Julius Kühn – Institutes in Berlin-Dahlem nicht nach Kleinmachnow zu verlagern.
Juni 2013	Abschluss eines Grundstückskaufvertrages mit dem Unternehmen CountR GmbH.
Okt. 2013	Herstellung eines Gehweges am "Stolper Weg" zwischen Fahrenheitstraße und Heidefeld und Markierung von Schutzstreifen auf der Fahrbahn.

Okt. 2013	Geländeauffüllung östliches MK-Gebiet und Haufwerksentsorgung im TIW-Gebiet.
April 2014	Abschluss eines Kaufvertrages mit der MWA zur Flächenerweiterung des Firmengeländes.
August 2014	Rechtskraft des B-Plans KLM-BP-006-c-4 „Verlängerung Fahrenheitstraße“.
2014/ 2015	Umsetzung der Maßnahmen zur Rekultivierung der gesicherten Deponie inkl. Herstellung der Rodelbahn (3. Bauabschnitt).
2014	Beginn der Erarbeitung des B-Plans KLM-BP-006-c-3 "TIW-Gebiet (Technik - Innovation - Wissenschaft)".
2014/ 2015	Errichtung des Bürogebäudes der CountR GmbH.
Februar 2015	Grundstückskaufvertrag mit Fr. Kusche-Andreeva über eine Erweiterungsfläche für das Unternehmen Direktmarketing Kusche GmbH (3.409 m ²)
Mai 2015	Freigabe der Pascalstraße als Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Stahnsdorfer Damm für den öffentlichen Verkehr
August 2015	Grundstückskaufvertrag mit Hr. P. Korr und Hr. V. Korr über eine Fläche zur Ansiedlung des Unternehmens Korr Dental Geräte Technik GbR (ca. 1.743 m ²)
September 2015	Grundstücksübertragungsvertrag mit der Gemeinde Kleinmachnow über die Wattstraße und Flächen des Grünzuges am Eichenhof (4.756 m ²)
Herbst 2015	Geländeregulierung und Abbruch Gewächshaus mit Nebenanlagen im B-Plangebiet KLM-BP-006-c-4.
2. Halbjahr 2015	Erarbeitung einer städtebaulichen Planungsstudie zu einer möglichen Wohnbebauung nördlich und südlich des Stahnsdorfer Damms.
2. Halbjahr 2015	Erarbeitung eines Wege- und Werbeleitsystems für das Bebauungsplangebiet KLM-BP-006-c-3.
Dezember 2015	Zuwendungsbescheid (Projektförderung) Ausbau der wirtschaftsnahmen kommunalen Infrastruktur (GRW-I) für den Fördermittelantrag Planungs- und Beratungsleistungen für das Bebauungsplangebiet „Technologie-Innovation-Wissenschaft“ in Kleinmachnow.
Februar 2016	Klausurtagung der Gemeindevertretung - Diskussion einer möglichen Wohnbebauung nördlich und südlich des Stahnsdorfer Damms.

Mai 2016	Aufstellungsbeschlüsse Bebauungspläne KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ und KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“.
Mai, Juni 2016	Grundstückskaufverträge mit GLK Gewerbe & Lagereinheiten Kleinmachnow GmbH & Co. KG (ca. 7.400 m²), STTS International GmbH (ca. 1.273 m²), MWA 292 m²).
September 2016	Vorlage der Überarbeitung der städtebaulichen Planungsstudie für das Gebiet nördlich und südlich des Stahnsdorfer Damms als Grundlage für die Bearbeitung der Bebauungspläne KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“, KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsd. Damm“ und KLM-BP-006-f „Landesfl. Nord“.
September 2016	Grundstückskaufvertrag Erweiterungsfläche GLK (ca. 527 m²).
November 2016	Vorlage des Anfangs- und Endwertgutachtens für den Bereich der Bebauungspläne KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ und KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“.
I. Halbjahr 2017	Gebäudeabriss inkl. Entsorgung gefährlicher Abfälle auf den Flächen „nördlich des Stahnsdorfer Damms“.
März 2017	Grundstückskaufvertrag Analytica Alimentaria (5.087 m²).
Ende 2016-2018	Herstellung Stichstraße zu den rückwärtigen Grundstücken an der Fahrenheitstraße.
2017	ILB Fördermittelantrag „Ausführungsleistung“ gestellt und Interessenbekundungsverfahren durchgeführt.
2017	Bieterverfahren zur Veräußerung der Kerngebietsflächen „nördlich Stolper Berg“.
Nov. 2017	Einreichung Bauantrag zur Geländeregulierung.
Feb. 2018	Beauftragung Planung der Verbindungstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg.
Feb. 2018	Rechtskraft Bebauungsplan KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“, Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses.
März/ April 2018	Durchführung der öffentlichen Teilnahmewettbewerbe für die Waldrodung und Geländeregulierung im Bebauungsplangebiet KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“.
Frühjahr 2018	Erarbeitung eines „energetischen Quartierskonzepts“ als Potentialanalyse und Grundlage für die Erarbeitung planungsrechtlicher Festlegungen in den Bebauungsplangebieten nördlich und südlich vom Stahnsdorfer Damms.

Juni/ Juli 2018	Unterzeichnung Kaufvertrag Wacker Neuson (11.218 m²).
Sept. 2018	Freigabe des Stolper Bergs für die Öffentlichkeit.
Okt. 2018	Unterzeichnung Kaufvertrag Hr. Drantmann (ca. 10.399 m²).
Dez. 2018	Unterzeichnung Kaufvertrag Christburk Grundbesitz GmbH (ca. 4.338 m²).
Januar 2019	Genehmigung des Bauantrages zur Geländeregulierung im TIW-Gebiet inkl. Waldumwandlungsantrag durch die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises PM (Einreichung des Bauantrages Nov. 2017).
2019/2020	Geländeregulierung im KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ inkl. Waldumwandlung und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
2019	Realisierung der Celsiusstraße (Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg).
2019	Realisierung und Freigabe des Sportplatzes südlich der Celsiusstraße.
Mai 2019	Unterzeichnung des Übertragungsvertrages für die Flächen des Stolper Berges und des Sportplatzes von der P&E auf die Gemeinde Kleinmachnow.
Mai 2019	Unterzeichnung Kaufvertrag Gesellschaft für Raumentwicklung 4U mbH (ca. 2.000 m²).
Mai 2019	Satzungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplanes KLM-BP-006-c-2 „östliches Kerngebiet“.
Mai 2019	Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan KLM-BP-006-c-5 „östl. Pascalstraße“.
2. Halbjahr 2019	Durchführung eines „ergebnisoffenen Wettbewerbs zu den städtebaulichen Fragen für die für Wohnen vorgesehenen Bereiche im Gebiet nördlich des Stahnsdorfer Damms“ (DS-Nr. 138/17).
Sep. 2019	Gutachten zur Fortschreibung der Anfangswerte und der Neuordnungswerte für die Fläche des Bebauungsplangebietes «KLM-BP-006-c-5 östlich Pascalstraße».
Dez. 2019	Erteilung des Zuwendungsbescheides über 1,85 Mio. EUR für Ausführungsleistungen im TIW-Gebiet. Der Antrag zur Förderung wurde im September 2017 über die Gemeinde Kleinmachnow bei der ILB eingereicht.
2019/ 2020	Fertigstellung der Celsiusstraße (Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg) inkl. Straßenbegleitgrün.
2020	Ausschreibung und Verkauf des Mischgebietes östlich der Pascalstraße.
2020	Vollständige Vermarktung der Flächen im TIW-Gebiet.

1.Quartal 2021	Abschluss der Geländeregulierung, Tiefenenttrümmerung und Altlastensanierung im KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ inkl. Waldumwandlung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
2021/2022	Herstellung der Grünzüge im TIW-Gebiet.
2021/2022	Realisierung der Zufahrt vom Dreilindener Weg zur Sicherung von vier Grundstückszufahrten (Privatstraße).
2022	Errichtung von zwei Grundwassermessstellen zur Sicherung der Trinkwasserschutzzone.
Nov. 2022	Abschluss der Ablösevereinbarung mit dem Eigentümer der Flächen „nördlich des Stahnsdorfer Damms“ (KLM-BP-006-e), dem Projektentwickler und der Gemeinde Kleinmachnow.
2. Halbjahr 2022	Umfeldgestaltung des Bereichs um den historischen Tunnelzugang der Boschwerke.
Dez. 2022	Unterzeichnung Kaufvertrag gewog Kleinmachnow mbH (Flächen östlich Pascalstraße, ca. 11.200 m²).
Feb. 2023	Rechtskraft des Bebauungsplanes KLM-BP-006-e Nördlich Stahnsdorfer Damm.
Juni 2023	Unterzeichnung Grundstückstauschvertrag Land Brandenburg über Flächen östlich der Pascalstraße
Frühjahr 2024	Rückbau der Garagen und Betonflächen südlich des Stahnsdorfer Damms im Gebiet KLM-BP-006-c-5 – östlich Pascalstraße
